



DIREZIONE DI PROGETTO PROGRAMMI DI FINANZIAMENTO EUROPEO

PNRR

Città metropolitana di Milano

Aggiornamento al 31/08/2026



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città
metropolitana
di Milano

I NUMERI DI CITTA' METROPOLITANA DI MILANO NEI PROGETTI PNRR

IMPORTO COMPLESSIVO CUP (comprensivo fonti proprie dei Comuni)


538.439.683,18 €

Numero CUP

248

- PUI Come In
- PUI Spugna
- PUI Cambio
- PUI Mica
- Pinqua
- Edilizia scolastica
- Forestazione
- Transizione Digitale
- CPI

CUP Finanziati PNRR/PNC

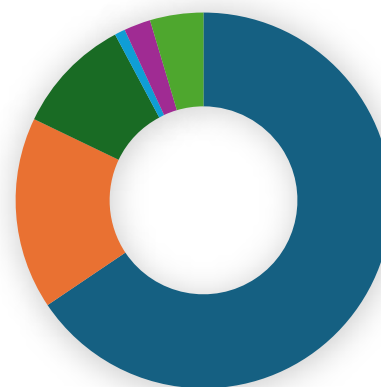

66%

■ PUI

16%

■ EDILIZIA SCOLASTICA

10%

■ PINQuA

1%

■ Forestazione

3%

■ Transizione digitale

5%

■ Politiche del lavoro



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città
metropolitana
di Milano

Stato di attuazione **PUI Come In**

IMPORTO COMPLESSIVO CUP (comprensivo fonti proprie dei Comuni)

93.942.710,35 €


Numero CUP

34

Numero CUP con lavori conclusi
al 30/06/2026

26

- ✓ **26 interventi conclusi** con raggiungimento del target al 30/06/2026
- ✓ **8 Comuni**, che non hanno raggiunto il target al 30/06/2026, a seguito del Decreto emanato in data 31/07/2026 dal Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia, sono tenuti alla conclusione dei lavori **entro il 31/12/2027** e rimane confermato ed invariato il finanziamento.

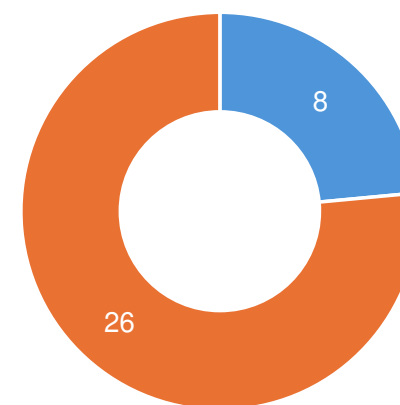

■ Progetti con ultimazione lavori al 31/12/2027

■ Progetti ultimati al 30/06/2026



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città
metropolitana
di Milano

Stato di attuazione **PUI Spugna**

IMPORTO COMPLESSIVO CUP (comprensivo fonti proprie dei Comuni)

50.426.269,98 €

Numero CUP


90

Numero CUP con lavori conclusi al
30/06/2026

88

- ✓ **88 CUP ultimati con certificato di fine lavori e CRE**
- ✓ **70 aree sono state riconsegnate in maniera permanente e definitiva.**

Per motivi tecnici **2 cantieri di Sesto San Giovanni non sono stati attuati e su proposta di Città metropolitana sono stati stralciati dal Ministero titolare a seguito del Decreto del 31/07/2026**

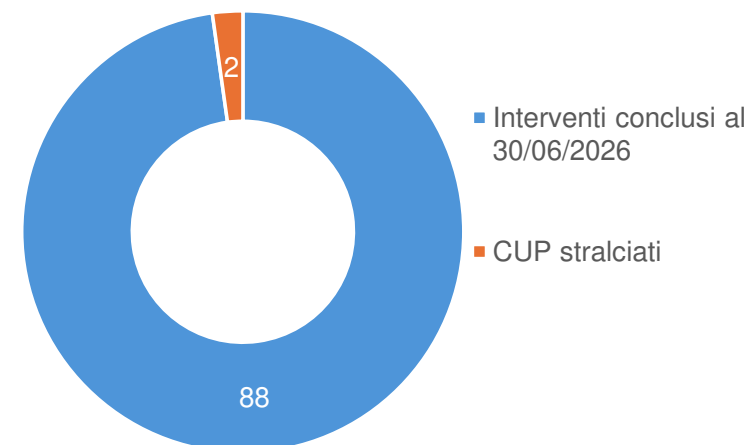

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città
metropolitana
di Milano

Stato di attuazione **PUI Cambio**

IMPORTO COMPLESSIVO CUP (comprensivo fonti proprie dei Comuni)

60.003.889,13 €

Numero CUP

5

Numero CUP con lavori conclusi al
30/06/2026


2

✓ **2 Interventi conclusi** (LINEA N. 2 e LINEA N. 7) con raggiungimento del target al 30/06/2026

Per le altre tre linee:

- **LINEA N. 5**
- **LINEA N. 12**
- **LINEA N. 15**

che non hanno raggiunto il target al 30/06/2026, a seguito del Decreto emanato in data 31/07/2026 dal Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia, sono tenuti alla conclusione dei lavori **entro il 31/12/2027** e rimane confermato ed invariato il finanziamento.

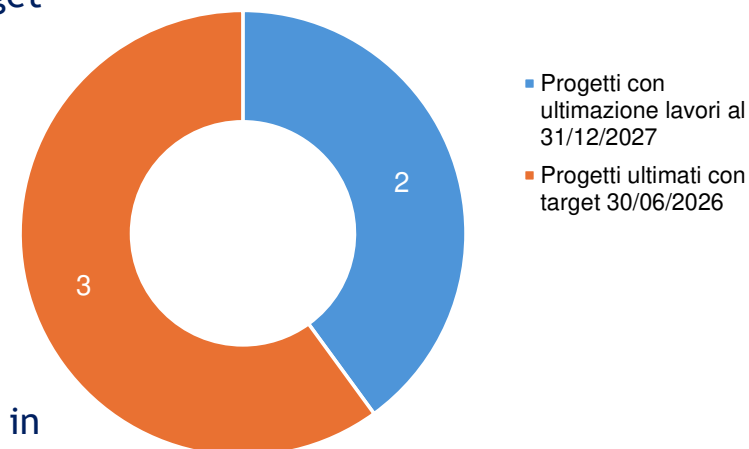

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città
metropolitana
di Milano

Stato di attuazione **PUI Mica**

IMPORTO COMPLESSIVO CUP (comprensivo fonti proprie dei Comuni)

117.382.731,88 €


Numero CUP

14

Numero CUP con lavori conclusi
al 30/06/2026

9

- ✓ **9 interventi (CUP) sono conclusi** (attestazione fine lavori) e la documentazione attestante il raggiungimento del target è stata correttamente inserita nel sistema REGIS.
- ✓ **5 interventi (CUP)** che non hanno raggiunto il target al 30/06/2026, a seguito del Decreto emanato in data 31/07/2026 dal Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia, sono tenuti alla conclusione dei lavori **entro il 31/12/2027** e rimane confermato ed invariato il finanziamento.

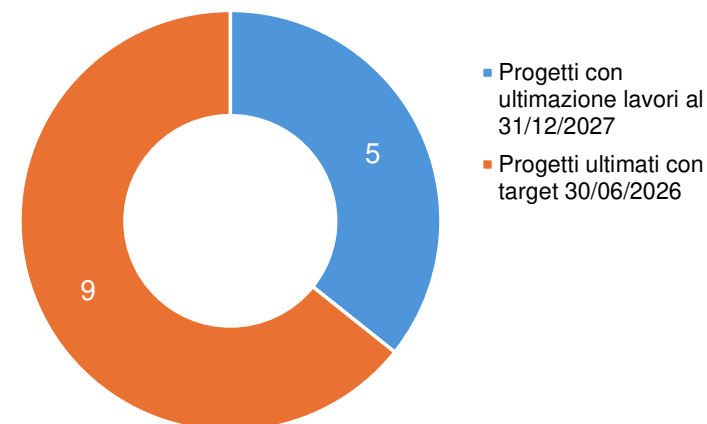

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città
metropolitana
di Milano

Stato di attuazione PINQuA

IMPORTO COMPLESSIVO CUP (comprensivo fonti proprie dei Comuni)

40.393.463,65 €


Numero CUP

22

Numero CUP con lavori conclusi al
30/06/2026

19

- ✓ 19 CUP risultano ultimati al 30/06/2026
- ✓ 2 CUP ultimati al 31/08/2026
- ✓ 1 CUP (Rescaldina) è aperto e attivo ma con conclusione oltre il 31/08/2026. Il Comune ha inviato al Ministero Titolare (MIT) richiesta di conferma del finanziamento.

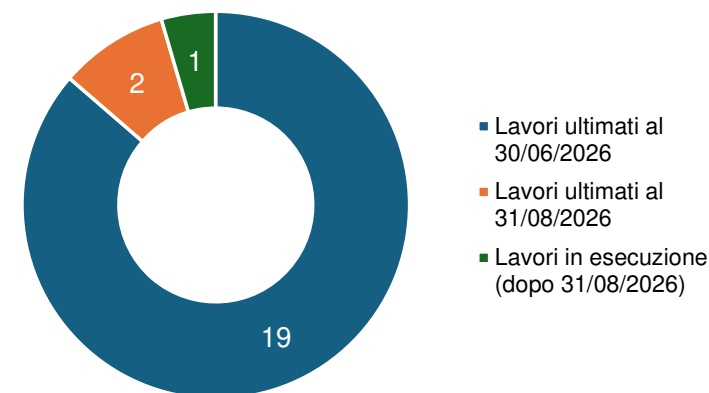

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città
metropolitana
di Milano

Stato di attuazione Edilizia Scolastica

IMPORTO COMPLESSIVO CUP (comprensivo fonti proprie dei Comuni)

146.357.411,21 €

Numero CUP

36


Numero CUP con lavori conclusi al
30/06/2026

32

Il Settore Competente ha presentato la richiesta di **variante in diminuzione** e una deroga al termine di completamento dei lavori dal 30/06/2026 al 31/08/2026 per i **seguenti 3 interventi**:

- Istituto Giorgi - Oriani Mazzini di viale Liguria
- Istituto Vespucci di via Valvassori Peroni
- Istituto P. Frisi di via Amoretti

I lavori si sono conclusi al **31/08/2026** in coerenza con le varianti e le deroghe presentate al Ministero

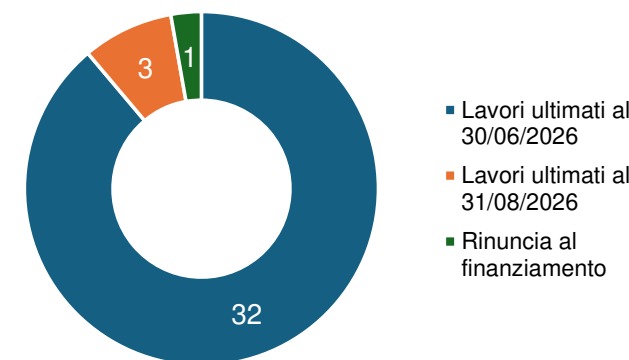

Per quanto riguarda i **3 progetti del Settore Efficiamento Energetico delle Infrastrutture**:

- 2 hanno concluso i lavori al 30/06/2026
- 1 CUP "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO/VENTILAZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI, con nota prot. n. 79220 del 23/04/2026 è stata comunicata al Ministero competente la **rinuncia al finanziamento** a causa di revoca dell'affidamento per l'esecuzione dei lavori, a seguito di espressa volontà dell'affidatario.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città
metropolitana
di Milano

Stato di attuazione **Forestazione**

IMPORTO COMPLESSIVO CUP (comprensivo fonti proprie dei Comuni)

2.688.256,80 €

Numero CUP

2


Numero CUP con lavori conclusi al
30/06/2026

2

Sono stati rilasciati i **certificati di fine lavori** per la fase di *transplanting* per entrambi gli interventi, che coincide con il raggiungimento del target al 30/06/2026 e sono stati emessi e approvati con Decreto i relativi CRE.

È stato rendicontato il **target di 62.518 piante messe a dimora al 30/06/2026**

È stata avviata la manutenzione quinquennale degli interventi.

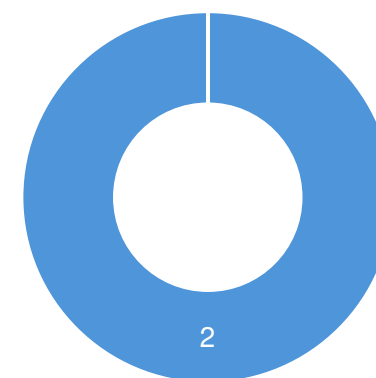

■ Interventi conclusi
al 30/06/2026



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città
metropolitana
di Milano

Stato di attuazione **Transizione Digitale**

IMPORTO COMPLESSIVO CUP (comprensivo fonti proprie dei Comuni)

2.983.861,76 €

Numero CUP


7

Numero CUP con lavori conclusi al
30/06/2026

6

Sono stati ultimati tutti i 6 progetti secondo le scadenze date dal Ministero Titolare della Misura

Il 2/09/2026 è stato pubblicato il Decreto di Finanziamento di un nuovo CUP per la Misura M1C1 I2.2.3 con scadenza 31/12/2026

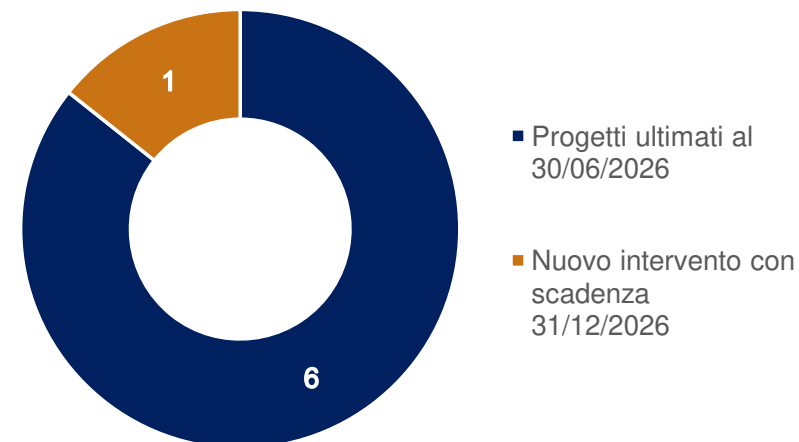

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città
metropolitana
di Milano

Stato di attuazione CPI

Obiettivo target nazionale	num. 500 CPI ristrutturati
Obiettivo target regionale	num. 74 CPI ristrutturati
Obiettivo target CMM	num. 17 CPI ristrutturati
Num CPI portati a target CMM	num. 16 CPI ristrutturati

Per il CPI Milano Carchidio i lavori non sono ancora ultimati

Il Target per questa Misura è riferito al numero dei CPI e non al numero dei CUP attivati



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città
metropolitana
di Milano

Stato avanzamento interventi CMM

CUP	Numero lavori conclusi	Interventi Decreto PUI (termine al 12.27)	Altri interventi in corso di interlocuzione	Numero interventi stralciati	TOTALE CUP
PUI MICA	9	5	0		14
COME IN	26	8	0		34
SPUGNA	88	0	0	2	90
PUI CAMBIO	2	3	0		5
EDILIZIA SCOLASTICA	35	0	0	1	36
PINQuA	21	0	1		22
Forestazione	2	0	0		2
Transizione digitale	7	0	0		7
Politiche del lavoro	33	0	5		38
TOTALI	223	16	6	3	248





Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città
metropolitana
di Milano

Stato avanzamento interventi CMM

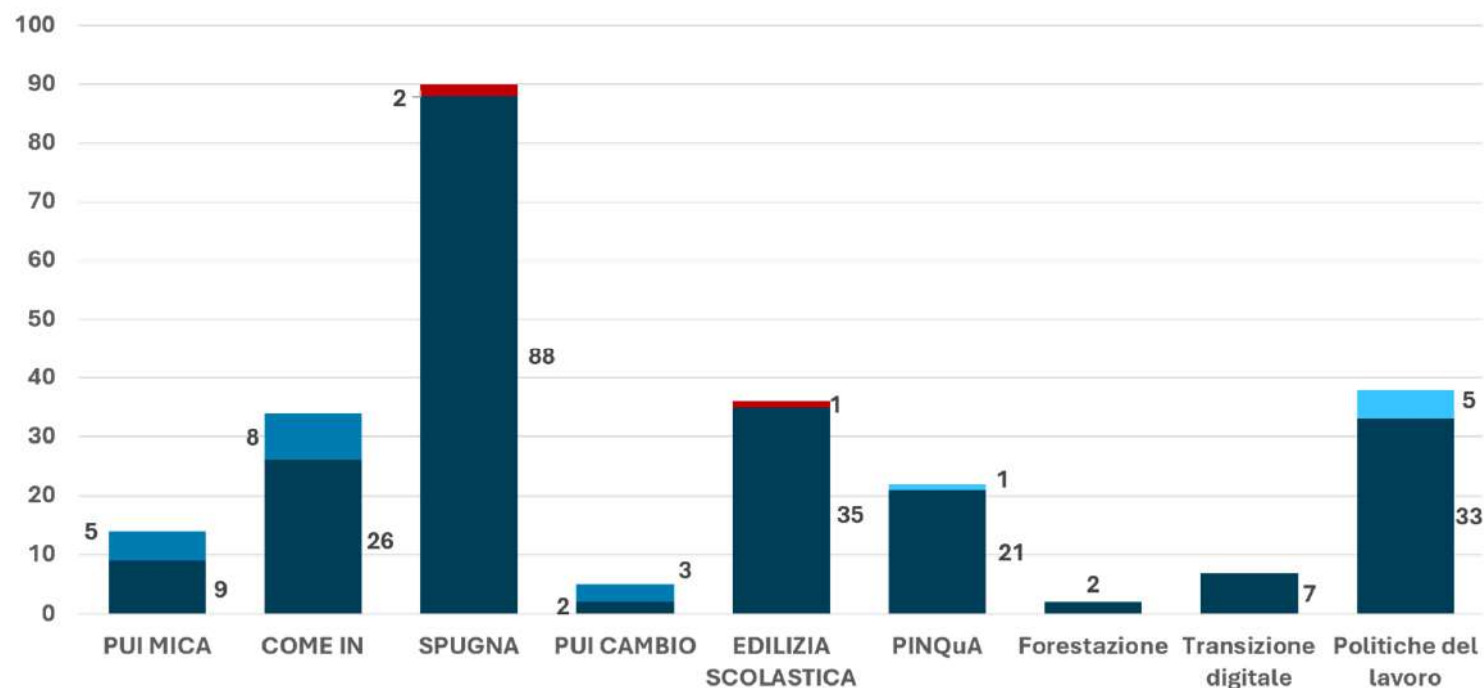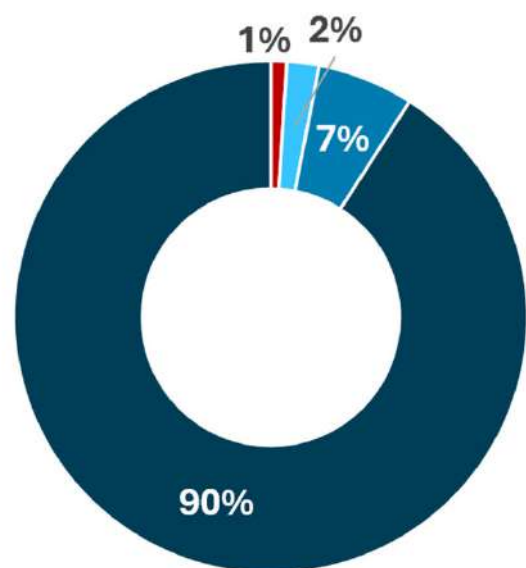

■ Numero interventi stralciati
 ■ Altri interventi in corso di interlocuzione con Ministero/Regione
 ■ Interventi inseriti Decreto PUI (termine 31.12.2027)
 ■ Numero progetti conclusi (M&T)



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città
metropolitana
di Milano
