CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

ATTUAZIONE DEL PNRR DI CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

CONTROLLO SULLA GESTIONE

(EX ART.7, COMMA 7, D.L. 31 MAGGIO 2021 N. 77)

DELIBERAZIONE n. 73/2025/GEST

CORTE DEI CONTI

CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_LOM - DEL-Reg.-SC_LOM - 0000073 - 03/04/2025 - 13:56

PRESIDENTE: ANTONIO BUCCARELLI

MAGISTRATO RELATORE: CONS. VITTORIA CERASI

Hanno collaborato

Dott. ssa Francesca Perreca

Dott.ssa Michela Ricciardi

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

Antonio Buccarelli	Presidente
Mauro Bonaretti	Consigliere
Vittoria Cerasi	Consigliere (Relatore)
Maura Carta	Consigliere
Marco Ferraro	Primo Referendario
Rita Gasparo	Primo Referendario
Francesco Liguori	Primo Referendario
Valeria Fusano	Primo Referendario
Adriana Caroselli	Referendario
Iole Genua	Referendario
Alessandro Mazzullo	Referendario

nella Camera di consiglio del 13 marzo 2025 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

VISTO l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;
VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte stessa in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il d. lgs 18 agosto 2000 n. 267 (Tuel);

VISTO l'articolo 7, commi 7 e 8, della legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

VISTO l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e successive modifiche ed integrazioni, che ha rafforzato le funzioni di controllo della Corte dei conti al fine di un più efficace coordinamento della finanza pubblica, adeguando il controllo sulla gestione finanziaria delle regioni e degli enti locali;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, riguardante il controllo sulla gestione della Corte dei conti sull'impiego delle risorse provenienti dai fondi di cui al PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza);

VISTA la circolare n.27 del MEF - Ragioneria Generale di Stato Prot.175451 del 21 giugno 2022 che introduce il sistema ReGiS per il monitoraggio degli interventi del PNRR;

VISTA la circolare n.29 del MEF-Ragioneria Generale di Stato Prot.201590 del 26 luglio 2022 che chiarisce la relazione tra i flussi finanziari e il sistema ReGiS per il monitoraggio dello stato di attuazione dei progetti del PNRR;

VISTE le deliberazioni SRCLOM/248/2022/GEST e SRCLOM/21/2024/GEST sulla ricognizione e sull'attuazione dei progetti del PNRR e PNC della Città metropolitana di Milano;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 3/2024/INPR "sulla Programmazione delle attività per l'anno 2024";

VISTA la deliberazione della Sezione regionale di controllo della Lombardia n. 45/2024/INPR con cui la Sezione ha definito gli obiettivi della programmazione dell'attività di controllo per l'anno 2024;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 8/2024/INPR "Linee Guida per la relazione dell'organo di revisione economico-finanziaria dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sul rendiconto 2023, per l'attuazione dell'art. 1, comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005 n. 266";

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 59/2024/REF "Relazione sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nel primo semestre 2024, redatta ai sensi dell'art. 7, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77";

VISTO il riscontro del 16 dicembre 2024, prot. Cdc n. 23670, con cui la Città metropolitana di Milano ha risposto alla nota istruttoria inviata dalla Sezione in data 14 novembre 2024, prot. n. 22682, sullo stato di attuazione del PNRR;

VISTA l'ordinanza n. 35 del 26 febbraio 2025, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato l'odierna Adunanza pubblica;

VISTA la memoria in merito all'attuazione dei progetti PNRR trasmessa il 10 marzo 2025, prot. Cdc n. 3173;

UDITO il relatore, Cons. Vittoria Cerasi

DELIBERA

di approvare la relazione avente ad oggetto "Attuazione del PNRR della Città metropolitana di Milano, controllo sulla gestione ex art.*7, comma 7, D.L. 31 maggio 2021 n. 77*".

La presente deliberazione e l'unita relazione saranno inviate al Sindaco metropolitano e al Presidente del Consiglio metropolitano, nonché all'Organo di revisione della Città metropolitana.

La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni") nelle modalità di legge, dando riscontro a questa Sezione dell'avvenuta pubblicazione.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 13 marzo 2025.

il Relatore

(Cons. Vittoria Cerasi)

VITTORIA CERASI
CORTE DEI CONTI
02.04.2025 17:41:51
GMT+02:00

il Presidente

(Antonio Buccarelli)

ANTONIO BUCCARELLI
CORTE DEI CONTI
02.04.2025 16:12:13
GMT+02:00

Depositata in Segreteria il
3 aprile 2025

Il Funzionario preposto
al servizio di supporto
(Susanna De Bernardis)

SUSANNA PAOLA DE BERNARDIS
CORTE DEI CONTI
03.04.2025 12:09:45
GMT+02:00

ATTUAZIONE DEL PNRR DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

CONTROLLO SULLA GESTIONE

(EX ART.7, COMMA 7, D.L. 31 MAGGIO 2021 N. 77)

SOMMARIO

1. Stato di attuazione degli interventi **10**

1.1 Avanzamento procedurale *14*

2. Criticita' nell'attuazione **17**

2.2 Avanzamento finanziario *17*

2.3 Anticipazione *18*

2.3 Definanziamento *21*

3. Tempi di rimborso da parte dei ministeri **23**

4. Applicazione delle norme contabili **25**

4.1 Fondo pluriennale vincolato *25*

4.2 Registrazione contabile *25*

5. Sistema di monitoraggio del comune **27**

5.1 La governance del PNRR *27*

5.2 Sistema dei controlli interni *27*

6. Contraddittorio pubblico **29**

7. Valutazioni conclusive **32**

Tabella 1 - Progetti PNRR e PNC suddivisi per missione e per tipologia 12
Tabella 2 - Fonti del finanziamento dei Progetti PNRR e PNC (in euro) 12
Tabella 3 - Aggiornamento attuazione procedurale al 30 gennaio 2025 15
Tabella 4 - Avanzamento Finanziario 17
Tabella 5 – Anticipazione al 31 dicembre 2023 20
Tabella 6 - Elenco dettagliato per CUP dei progetti per stato di attuazione 35

Grafico 1 – Fonti del finanziamento dei progetti PNRR e PNC 13
Grafico 2 – Stato di attuazione procedurale al 30 giugno 2024.....15
Grafico 3 – Stato di attuazione finanziaria (pagamenti su impegni) per Missione.....18

1. STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

In continuità con le deliberazioni di questa Sezione regionale di controllo n. 248/2022/GEST e n. 21/2024/GEST, in relazione alle attività programmate nella deliberazione n. 45/2024/INPR da questa stessa Sezione si è proceduto al monitoraggio dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale Complementare (PNC) di cui la Città metropolitana di Milano è soggetto attuatore o beneficiario all'interno di una o più Missioni, Componenti, ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge n. 77/2021, convertito dalla legge n. 108/2021.

La Sezione ha potuto verificare lo stato di avanzamento sull'insieme degli interventi di cui la Città metropolitana di Milano è soggetto attuatore/beneficiaria avvalendosi degli esiti dell'attività istruttoria, avendo attinto ai dati disponibili sulla piattaforma ReGiS[1] e nella Tabella PNRR allegata al bilancio di previsione 2024-2026. Quest'ultima fonte informativa è frutto dell'adempimento[2] richiesto ai revisori dei conti dell'ente locale dalla Sezione delle Autonomie: si tratta di una cartella Excel in cui vengono inserite informazioni circa l'avanzamento finanziario al 31 dicembre 2023 e lo stato di attuazione dei singoli progetti del PNRR e PNC al 30 giugno 2024.

Innanzitutto, si è proceduto ad un controllo puntuale dell'elenco dei progetti individuati da un Codice Unico di Progetto (CUP) finanziati con fondi PNRR e PNC. Laddove si è riscontrata una discrasia sono stati richiesti chiarimenti all'Ente per poter giungere ad un insieme "omogeneo" dei progetti su cui svolgere l'analisi, tenendo conto anche che, a seguito della decisione del Consiglio UE 8 dicembre 2023, alcuni progetti sono stati de-finanziati.

Dall'esame della tabella trasmessa dalla Sezione delle Autonomie, e compilata dall'Organo di revisione dell'Ente, sono stati evidenziati n. 160 CUP per la Città

[1] Le informazioni circa gli interventi vengono monitorate attraverso ReGiS, che, come stabilisce la circolare del MEF-RGS n.27 del 21 giugno 2022, è la piattaforma informatica unica alimentata dai soggetti attuatori coi dati relativi ai progetti del PNRR. La stessa circolare chiarisce che "*I soggetti Attuatori sono responsabili della corretta alimentazione del sistema ReGiS con i dati di programmazione ed attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi ai progetti di loro competenza. In particolare, provvedono, con cadenza mensile ad aggiornare i dati registrati sul sistema e renderli disponibili per le Amministrazioni titolari delle misure ai fini delle operazioni di controllo e validazione di competenza*." Inoltre, la successiva circolare del MEF-RGS n. 29 del 26 luglio 2022 ha stabilito che la piattaforma ReGiS costituisce la base informativa su cui vengono registrate le varie fasi di attuazione del piano, ovvero avvio, finanziamento, stato di avanzamento dei lavori, fino alla rendicontazione finale, da parte delle Amministrazioni titolari degli interventi del PNRR.

[2] La Sezione delle Autonomie in allegato alle Linee Guida sul bilancio di previsione 2024-2026 (Deliberazione n. 7/SEZAUT/2024/INPR) ha richiesto ai revisori dei conti degli enti locali di compilare una tabella con i dati relativi ai progetti attivati, fornendo informazioni circa lo stato di avanzamento finanziario procedurale e fisico dei singoli CUP. I revisori hanno dovuto trasmettere la "Tabella PNRR" non oltre il termine del 30 settembre 2024. È bene chiarire che mentre lo stato di avanzamento procedurale si riferisce al 30 giugno 2024, lo stato dell'avanzamento finanziario è quello accertato dai dati di bilancio al 31 dicembre 2023. Per rappresentare lo stato degli impegni e dei pagamenti si è attinto alle informazioni aggiornate alla data 30 gennaio 2025 dalla piattaforma ReGiS.

metropolitana di Milano, da cui si sono dovuti sottrarre n. 5 CUP relativi a progetti di cui l'Ente non è risultato né soggetto attuatore né beneficiario. Dall'esame risultano quindi n. 155 CUP. È da osservare come per n. 22 CUP (intervento PINQUA) l'Ente dichiara di essere soggetto beneficiario, come chiarito nelle precedenti delibere la Città metropolitana è comunque soggetto attuatore anche se il soggetto esecutore è il comune su cui viene attuato l'intervento.

Dai dati estratti dalla Piattaforma ReGiS al 30 gennaio 2025 risultano n. 157 CUP. Tuttavia, il CUP I32F23000440001 risultato doppio, è stato eliminato in quanto probabile errore materiale di imputazione. Rimangono dunque n. 156 CUP. Da un confronto tra le due fonti informative (Tabella PNRR e piattaforma ReGiS) risulta che a questi CUP occorre aggiungere il CUP I54F23000060006 presente nella Tabella PNRR e nella piattaforma ReGiS, laddove si effettua la ricerca per "Anagrafica progetto", ma non rilevato attraverso la funzione di "*download* massivo". Si perviene dunque ad un insieme complessivo di n.157 CUP.

Una piena conciliazione degli interventi così ottenuta, si ottiene mettendo a confronto i dati di cui alla Tabella PNRR (n.155 CUP) a cui sono stati aggiunti n.2 CUP, relativi all'intervento M2C4I3.1 (I32F23000440001-Incrementare il capitale naturale per rafforzare la rete ecologica territoriale - CMM1; I52F23000320001 - La forestazione urbana per mitigare l'isola di calore – CMM2) presenti solo sulla piattaforma ReGiS, in quanto relativi a due progetti finanziati con decreto del Sindaco del 3 ottobre 2024. In considerazione di tale data, successiva al 30 giugno 2024 (termine cui si fermano le informazioni compilate dai revisori dell'Ente nella Tabella PNRR), non sono stati infatti valorizzati nella tabella medesima.

Infine, il CUP I46G24000000006, nonostante sia presente nel riscontro istruttorio, non risulta né nella Tabella PNRR e neppure in ReGiS. Il progetto è stato infatti finanziato nel mese di dicembre 2024, così come emerge dall'approvazione della proposta di finanziamento di cui all'Allegato A - Graduatoria definitiva delle proposte progettuali ammesse e totalmente finanziabili (PNRR Missione 1 - Componente 1 - Investimento 1.5 "Cybersecurity"), di cui all' Avviso pubblico n. 08/2024 (ACN.AOO_ACN-US. Registro Unico 0043937.31-12-2024.I). Tale CUP è stato dunque escluso dall'insieme dei progetti in quanto non si hanno informazioni né sullo stato di avanzamento finanziario né su quello di attuazione.

La Città metropolitana di Milano risulta, pertanto, soggetto attuatore/beneficiaria di n. 157 interventi, che corrispondono ad altrettanti CUP (Codice Unico di Progetto), così come rappresentati nella seguente tabella, aggregati per Missione.

Tabella 1 - Progetti PNRR e PNC suddivisi per missione e per tipologia

	n. CUP	Lump Sum	non nativi PNRR
M1 - Digitalizzazione della PA	2	1	-
M2 - Mobilità sostenibile e tutela del territorio	3	-	1
M4 - Potenziamento dell'istruzione, dall'università agli asili nido	35	-	33
M5 - Infrastrutture sociali per le famiglie e le comunità	117	-	16
Totale	**157**		**50**

Fonte: Elaborazione Cdc sulla base della Tabella PNRR e dal riscontro dell'Ente (*).

Dalla tabella risulta solo un progetto della tipologia *Lump-Sum*[3] nella Missione 1 (Digitalizzazione della PA). Dal confronto tra i dati forniti dall'Ente in sede istruttoria e quelli relativi alla tabella della Sezione delle Autonomie, risultano n. 50 progetti della tipologia "*non nativi PNRR*", la cui origine precede il PNRR[4], la maggior parte nelle Missioni 4 e 5.

Nella tabella sottostante sono valorizzate le fonti del finanziamento, considerando l'insieme dei progetti aggregati per Missione.

Tabella 2 - Fonti del finanziamento dei Progetti PNRR e PNC (in euro)

	Fondi PNRR	Fondi PNC	FOI	Fondi provincia	altri fondi	Fondi comune	Fondi pubbl. totali	Perc.del totale
M1	664.720,00						664.720,00	0,2%
M2	26.688.256,80		2.400.000,00				29.088.256,80	9,9%
M4	102.335.225,32		5.379.190,72	4.812.533,67			112.526.949,71	38,3%
M5	83.753.807,24	9.018.026,47	16.664.793,20		37.989.576,95	3.722.915,82	151.149.119,68	51,5%
TOT.	**213.442.009,36**	**9.018.026,47**	**24.443.983,92**	**4.812.533,67**	**37.989.576,95**	**3.722.915,82**	**293.429.046,19**	100,0%

Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base dei dati ReGiS (dati al 30-1-2025)

Città metropolitana di Milano risulta essere soggetto attuatore/beneficiario per un ammontare complessivo di 222,5 milioni, costituito da 213,4 milioni di fondi PNRR e 9 milioni di fondi PNC. Tra fondi PNRR, PNC e altri fondi pubblici (FOI, fondi statali, fondi dei Comuni e dell'Ente) si ottiene un ammontare totale pari a 293,4 milioni.

[3] Si tratta di misure che assegnano contributi forfettari, diversamente dagli altri interventi del PNRR. Per tali misure non è prevista la rendicontazione della spesa attraverso il sistema ReGiS, bensì la richiesta di erogazione del contributo, corredata della documentazione relativa al raggiungimento dell'obiettivo assegnato, a seguito della quale, dopo i controlli del Dipartimento per la transizione digitale, vengono erogate le risorse. Inoltre, per questi progetti non sono previsti acconti, come accade invece per le altre misure, ma il pagamento in un'unica soluzione a obiettivo raggiunto e verificato.

[4] In quanto progetti non originati nell'ambito del PNRR, occorre che nella fase di rendicontazione possano soddisfare i vincoli posti dal piano quale per esempio i vincoli di sostenibilità ambientale, noti con l'acronimo DNSH (*Do Not Significant Harm*), ovvero che non arrechino danni agli obiettivi di salvaguardia ambientale.

Grafico 1 – Fonti del finanziamento dei progetti PNRR e PNC

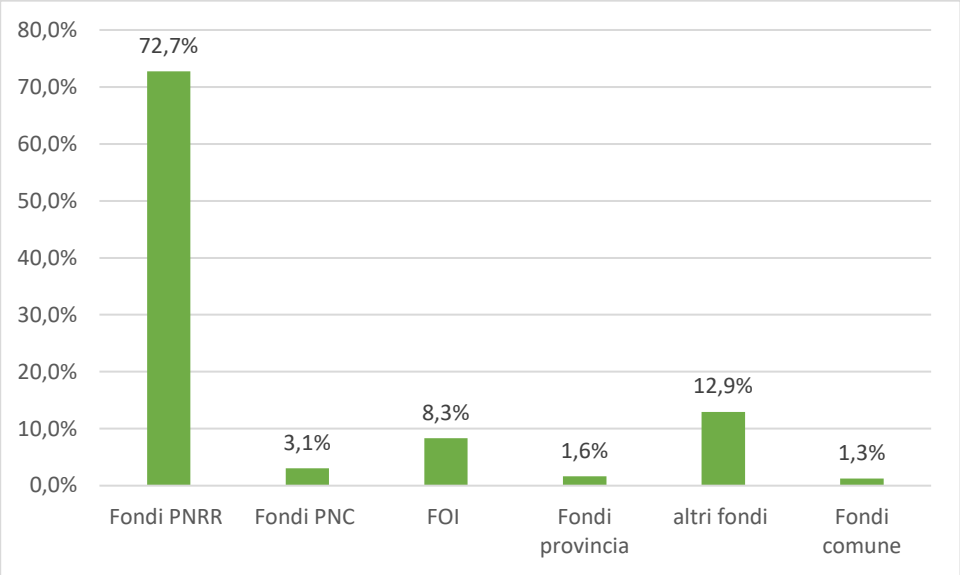

Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base dei dati ReGiS (dati al 30 gennaio 2025)

La Sezione ha potuto accertare che le risorse provenienti dal dispositivo *Recovery and Resilience Facility* (RRF), ovvero il fondo che finanzia il PNRR, corrispondono al 73 per cento circa del totale, mentre le risorse del Piano Nazionale Complementare (PNC), ovvero il finanziamento nazionale che complementa il PNRR e che segue sia per la rendicontazione sia per l'attuazione le stesse procedure del PNRR, sono pari al 3 per cento del totale. Il resto delle risorse proviene da fondi propri sia dell'Ente sia dei comuni (soggetti esecutori) per il 3 per cento circa; dal Fondo per le Opere Indifferibili (FOI)[5], risorse che contribuiscono con l'8 per cento circa dei fondi complessivi, a cui si aggiungono il 13 per cento circa di Fondi statali.

Per una descrizione più dettagliata dei singoli interventi e del loro finanziamento si rimanda al sito di Città metropolitana di Milano sezione "Amministrazione Trasparente" [6].

[5] Per fronteggiare l'eccezionale aumento dei materiali da costruzione negli appalti pubblici, che rende difficoltoso l'avvio delle gare per nuove opere, il decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50 (c.d. DL Aiuti), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ha previsto un meccanismo di adeguamento delle basi di asta. Nello specifico, l'articolo 26, comma 7, del predetto DL n. 50/2022 ha istituito il Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, finalizzato a consentire l'avvio entro il 31 dicembre 2022 delle procedure di affidamento previste dai cronoprogrammi degli interventi. Allo stanziamento iniziale di complessivi 7.500 milioni di euro, sono stati aggiunti ulteriori 1.300 milioni, previsti dall'articolo 34 del DL n. 115/2022, per complessivi 8,8 miliardi di euro dal 2022 al 2027.
(*https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/monitoraggio/piano_nazionale_per_gli_investimenti_complementari_al_pnrr/fondo_opere_indifferibili/*).

[6] https://www.cittametropolitana.mi.it/PNRR/

1.1 Avanzamento procedurale

È stato possibile accertare lo stato di avanzamento procedurale dei progetti, di cui la Città metropolitana di Milano, è soggetto attuatore attingendo da due fonti di informazioni: dalla tabella PNRR, che riporta quanto riferito dai revisori dell'Ente alla data del 30 giugno 2024 in relazione alle fasi della procedura; nonché quanto allo stato del singolo CUP ("in corso/concluso"), dalla piattaforma ReGiS alla data del 30 gennaio 2025.

Sulla base di quanto emerge nella Tabella PNRR, si rileva la seguente situazione complessiva:

- n. 6 CUP, di cui n. 5 "progetti in essere", sono nella fase di aggiudicazione. Tutti gli interventi risultano in corso;
- n. 119 CUP, di cui n. 34 "progetti in essere", risultano nella fase di stipula contratto. Gli interventi risultano ancora tutti in corso ad eccezione di un CUP (C97H21000140005), che è concluso. Inoltre, per il CUP I54F23000060006 (M1C1-Digitalizzazione innovazione e sicurezza nella PA) non sono state fornite informazioni circa lo stato della procedura, anche se dal riscontro istruttorio è emerso che l'Ente ha richiesto, per questo, un'anticipazione in due momenti, rispettivamente del 10 e del 20 per cento. Inoltre, non è indicato se si tratta o meno di un progetto già in essere.
  Tra i 34 CUP vi sono n.22 CUP dell'intervento M5C2I2.03-Programma innovativo della qualità dell'abitare di cui Città metropolitana è solo soggetto beneficiario, ma la cui esecuzione è delegata ai comuni dell'hinterland milanese. Su questi CUP la Sezione si era espressa nella precedente deliberazione raccomandando all'Ente di monitorare lo stato di attuazione in quanto era stata accertata una percentuale maggiore di progetti in una fase procedurale più arretrata rispetto alla maggior parte del resto dei progetti. In effetti questi progetti dalla Tabella PNRR risultano essere tutti ancora alla fase di "stipula contratto".
- n. 26 CUP, di cui n. 8 CUP progetti in essere, risultano in fase di esecuzione. Tutti gli interventi sono in corso.
- n. 4 CUP, di cui n. 3 CUP progetti in essere, hanno superato la fase di collaudo.

A questi devono essere poi aggiunti n. 2 CUP (I32F23000440001 - I52F23000320001) dell'intervento nella Missione 2 Componente 4 presenti sulla piattaforma ReGiS, ma assenti nella Tabella PNRR, come già sopra descritto.

La Sezione sulla base del riscontro istruttorio ha quindi potuto verificare la fase procedurale di ogni singolo progetto del PNRR o del PNC della Città metropolitana di Milano. Il grafico seguente ne fornisce in termini aggregati lo stato di attuazione procedurale.

Grafico 2 – Stato di attuazione procedurale al 30 giugno 2024

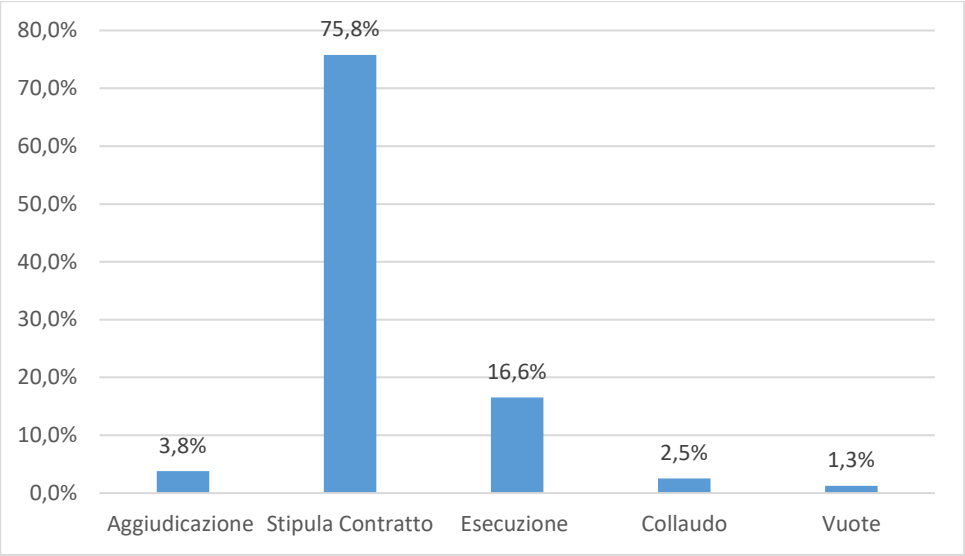

Fonte: Elaborazione Corte dei conti - dati tabella PNRR

Il grafico consente di verificare lo stato di avanzamento procedurale al 30 giugno 2024, tenuto conto di quanto indicato dal revisore nella tabella PNRR. In particolare, emerge che mentre il 76 per cento dei progetti è nella fase di stipula del contratto, solo il 17 per cento dei progetti è in esecuzione. Infine, solo il 2,5 per cento (n.4 progetti) sono in fase di collaudo e dunque quasi completati.

Dai dati estratti da ReGiS al 30 gennaio 2025, questa Sezione ha potuto verificare lo stato di avanzamento fisico dei progetti, in relazione al numero di progetti conclusi.

Nella tabella che segue si rappresenta lo stato dei CUP conclusi o ancora in corso, per ciascuna missione, nonché i progetti in essere (c.d. "non nativi" PNRR) e i progetti *Lump Sum,* come riferito dall'Ente in sede di riscontro istruttorio.

Tabella 3 - Aggiornamento attuazione procedurale al 30 gennaio 2025

	CUP	CUP conclusi	CUP in corso	% CUP conclusi sul totale dei CUP	Progetti *Lump Sum*	Progetti "non nativi" PNRR
M1	2		2	0%	1	
M2	3		3	0%		1
M4	35		35	0%		33
M5	117	1	116	0,8%		16
PNC						
	157	**1**	**156**	0,8%	**1**	**50**

Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base dei dati rilevati sulla piattaforma ReGiS al 30 gennaio 2025 e sui dati forniti in sede di riscontro istruttorio (prot. Cdc n. 23670 del 16 dicembre 2024).

Dall'esame della tabella emerge che solo un progetto nella Missione 5 risulta concluso al 30 gennaio 2025, mostrando dunque un progresso di poco conto rispetto alla situazione rilevata al 30 giugno 2024 dai dati della Tabella PNRR. Emerge quindi una situazione in cui la percentuale di progetti conclusi è irrisoria rispetto al numero totale di progetti, tenuto anche conto dell'elevato numero di progetti "non nativi", che dovrebbero seguire un iter procedurale più spedito essendo stati approvati prima dell'avvento del PNRR.

Si evidenzia che gli interventi finanziati con i fondi del PNRR seguono un cronoprogramma predefinito a livello nazionale. Questo implica che i diversi progetti si sviluppano nel rispetto della sequenza temporale con cui ciascuna fase dell'intervento deve essere completata. Per quanto concerne il rispetto del cronoprogramma, la Sezione si è affidata innanzitutto alle informazioni rilasciate dai revisori dell'Ente, così come riportate nella tabella PNRR allegata al Questionario sul bilancio di previsione 2024-2026.
Dalla Tabella PNRR, sulla base di quanto dichiarato dai revisori quindi, nonché da quanto riferito dall'Ente in sede di riscontro istruttorio, è stato possibile ricavare le informazioni circa il rispetto del cronoprogramma al 30 giugno 2024.
Alla data del 30 giugno 2024 dunque risultavano in ritardo rispetto al cronoprogramma n. 10 progetti dell'intervento M5C2I2.02-Piani urbani integrati (PUI13 Città metropolitana Spugna). In particolare, per n. 7 CUP l'Ente ha confermato che la criticità riguardava la "*necessità di attendere periodo idoneo per completamento delle piantumazioni*", anche se in via di risoluzione. Per n. 3 CUP, invece, informa che analoga criticità è stata superata.

2. CRITICITA' NELL'ATTUAZIONE

Nella Tabella PNRR l'Ente segnalava criticità nell'attuazione dovute a carenza di personale riguardante diversi progetti (n. 63 CUP). A fronte di richiesta specifica di questa Sezione, l'Ente riferisce che la carenza di personale riguarda tutti i CUP. In particolare, i profili tecnico/specialistici ed economico/finanziari. Per affrontare questa situazione, la Città metropolitana ha adottato diverse strategie, tra cui assunzioni a tempo determinato finanziate con risorse specifiche. Sono state assunte due risorse per i progetti PinQua e altre due, di cui una part-time, per i PUI "*Come in*" e "*Cambio*". Inoltre, è in fase di pubblicazione una gara, finanziata con risorse di bilancio, per un servizio di assistenza tecnico-specialistica per la gestione e rendicontazione degli interventi PNRR. Infine, è stato approvato un Protocollo di collaborazione con Regione Lombardia (decreto sindacale n.275/2024 del 31 ottobre 2024) al fine di ottenere un supporto tecnico-operativo da parte degli esperti assunti dalla Regione con fondi PNRR su vari procedimenti complessi, come appalti e autorizzazioni ambientali, ma non per l'attività di rendicontazione dei progetti finanziati dal PNRR.

2.2 Avanzamento finanziario

Dall'esame dei dati estratti dalla piattaforma ReGiS al 30 gennaio 2025 è stato possibile esaminare lo stato di avanzamento finanziario dei n. 157 CUP.[7]

Tabella 4 - Avanzamento Finanziario

	Fondi totali	Impegni	Pagamenti	% impegnato/Fondi totali	% pagato/impegnato
M1	664.720,00	-	-		
M2	29.088.256,80	24.186.920,94	10.426.685,31	83,15%	43,11%
M4	112.526.949,71	95.700.627,61	43.328.247,04	85%	45%
M5	151.149.119,68	126.627.404,60	35.952.014,08	83,77%	28,39%
TOT.	**293.429.046,19**	**246.514.953,15**	**89.706.946,43**	**84%**	**36,39%**

Fonte: elaborazione Cdc sui dati ReGiS al 30 gennaio 2025

La tabella mostra l'avanzamento finanziario degli impegni e dei pagamenti rispetto alle risorse a disposizione della Città metropolitana di Milano per l'attuazione dei progetti. In particolare, si riscontra una percentuale complessiva dell'84 per cento dell'impegnato sui fondi totali, con minime differenze tra le varie missioni. Per quanto

[7] Con riferimento al CUP I69J21000980001 (M4C1I3.03-Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica), per il quale la Sezione aveva riscontrato un errore di imputazione dell'importo nella tabella PNRR, l'Ente ha comunicato che i revisori hanno inviato una comunicazione di rettifica alla Sezione delle Autonomie.

riguarda invece i pagamenti in relazione agli impegni si osserva una percentuale del 36,4 per cento a denotare un'inerzia nei pagamenti.

Grafico 3 – Stato di attuazione finanziaria (pagamenti su impegni) per Missione

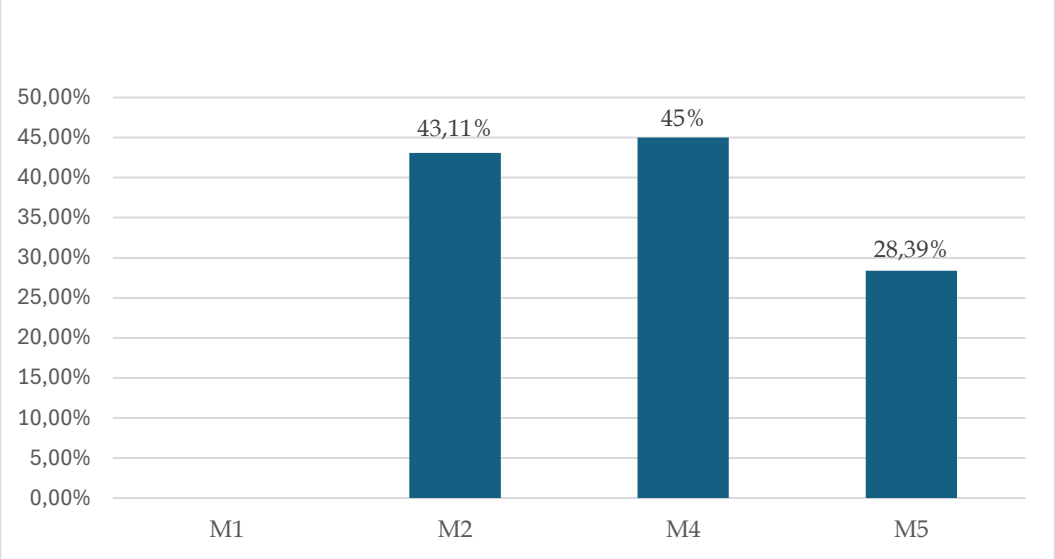

Fonte: elaborazione Cdc sui dati ReGiS al 30 gennaio 2025

Tale situazione è più accentuata nei progetti della missione 5 dove la percentuale è pari al 29 per cento. Anche nelle Missioni 2 e 4 i pagamenti non superano il 50 per cento degli impegni.

2.3 Anticipazione

L'avanzamento dello stato procedurale dei progetti, e quindi della realizzazione delle opere, può collegarsi anche all'erogazione delle anticipazioni che ha contribuito all' accelerazione delle stesse. Data la previsione dell'erogazione delle risorse solo dopo la rendicontazione delle spese, l'anticipazione si è resa necessaria per ovviare alle carenze di liquidità delle amministrazioni locali per l'effettuazione dei pagamenti in corso d'opera con riflessi sul rallentamento dei progetti.

Per quanto riguarda i fondi richiesti e ottenuti dall'Ente in forma di anticipazione, ci si è basati sulle informazioni fornite dai revisori dei conti nella relazione sul PNRR allegata al bilancio di previsione 2024-2026, così come richiesto dalla Sezione delle Autonomie. Occorre ribadire che i dati finanziari tratti dalla Tabella PNRR si riferiscono ai dati di consuntivo al 31 dicembre 2023, quindi registrano la situazione con ritardo rispetto ai dati sull'avanzamento finanziario estratti da ReGiS, su cui non

sono rinvenibili i dati delle anticipazioni. Le informazioni vengono riassunte in forma aggregata per Missione nella seguente tabella.

Tabella 5 – Anticipazione al 31 dicembre 2023

MISSIONI	CUP	Importo finanziamento PNRR e/o PNC	Anticipazione PNRR	Impegni su risorse PNRR e PNC	FPV di spesa attivato per erogazione anticipazione PNRR	Pagamenti PNRR e PNC
M1	2	664.720,00	-	-	-	-
M2	3	24.000.000,00	-	1.353.590,68	-	1.339.667,36
M4	35	102.335.225,32	20.609.633,59	29.241.839,14	7.191.228,53	20.917.569,21
M5	117	105.831.520,84	13.026.141,13	9.521.073,67	4.179.695,41	4.057.880,40
PNC	-	-	-	-	-	-
Totale	**157**	**232.831.466,16**	**33.635.774,72**	**40.116.503,49**	**11.370.923,94**	**26.315.116,97**

Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base dei dati della Tabella PNRR.

Dall'esame della tabella emerge innanzitutto che le anticipazioni sui n. 157 CUP costituiscono il 14,44 per cento del totale dei fondi, ovvero una percentuale superiore al 10 per cento stabilita inizialmente per i fondi PNRR. Tuttavia, occorre precisare che le anticipazioni sono state assegnate solo per una quota parte degli interventi, quindi non per tutti i CUP. In particolare, gli interventi della Missione 1 e della Missione 2 non hanno ricevuto l'anticipazione; mentre sono stati oggetti di assegnazione n. 26 CUP su n. 35 della Missione 4 e tutti i n. 117 CUP della Missione 5.

I dati della tabella PNRR si riferiscono, peraltro, ad una data precedente alla modifica della normativa sulle anticipazioni intervenuta con l'art. 11 co. 1 del d.l. n. 19/2024 che ha previsto l'innalzamento della quota del 10 per cento al 30 per cento dell'importo concesso da erogare entro 30 giorni dalla richiesta, previo controllo della documentazione e registrazione nel sistema ReGiS.[8]

Infine, il totale dei pagamenti, pari a 26 milioni, a valere sulle risorse PNRR e/o PNC, risulta complessivamente inferiore rispetto all'anticipazione ricevuta, pari a 33 milioni.

[8] A livello di intervento, la norma trova applicazione sia per i nuovi progetti finanziati a valere sul fondo Next Generation EU-Italia, sia per i c.d. "progetti in essere", le cui risorse finanziarie sono recate da specifiche autorizzazioni di spesa già previste a legislazione vigente. Nel mese di dicembre 2024 è stato emanato il decreto attuativo per semplificare le procedure di finanziamento dei progetti previsti dal PNRR. Il decreto, operativo dal 4 gennaio 2025 (data di pubblicazione sulla G.U.) e basato sull'art. 18-quinquies del decreto-legge 9 agosto 2024 n. 113 (c.d. "Dl Omnibus"), mira a velocizzare i pagamenti trasferendo fino al 90 per cento del costo degli interventi entro 30 giorni dalla richiesta da parte dei soggetti attuatori. Di conseguenza, le verifiche sulla documentazione saranno concentrate solo nella fase finale, prima dell'erogazione del saldo, per accelerare l'esecuzione degli interventi, con l'obbligo, da parte dei soggetti attuatori e delle Amministrazioni centrali, di aggiornare regolarmente i dati di monitoraggio nel sistema ReGiS.

2.3 Definanziamento

La versione iniziale del PNRR (approvata dal Consiglio della UE del 13 luglio 2021) è stata oggetto finora di quattro modifiche[9].
La più rilevante è stata richiesta dal Governo ad agosto 2023 ed è stata approvata dal Consiglio della UE l'8 dicembre 2023 con una rimodulazione e un incremento di 2,9 miliardi dei fondi UE a favore dell'Italia (attualmente pari a 194,4 miliardi) con l'inserimento della nuova Missione 7 (RePowerEU) ed altre modifiche alle misure originariamente previste. Queste ultime sono divenute necessarie per criticità di natura oggettiva dovute principalmente all'aumento dei costi, alla scarsità di materiali, ai limiti del sistema produttivo[10].

Dopo la revisione del PNRR, approvata con decisione del Consiglio dell'UE dell'8 dicembre 2023, alcune misure sono state de-finanziate totalmente o parzialmente, ovvero sono state sostituite le fonti del finanziamento con fondi statali o di altra fonte europea.
Il decreto-legge 2 marzo 2024 n. 19, recante "*Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR*)", convertito nella legge 29 aprile 2024, n. 56, all'art. 1 ha riconosciuto l'esigenza di recuperare le necessarie risorse finanziarie per coprire il fabbisogno necessario per assicurare continuità attuativa alle misure definanziate dal Piano.

La predetta normativa ha *salvaguardato i progetti con obbligazioni giuridicamente vincolanti*, vale a dire quelli per i quali vi sia stata l'assunzione dell'impegno contabile ai sensi dell'articolo 34, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 oppure nei casi di stipula del contratto.

La norma ha, inoltre, previsto che, dopo l'individuazione degli interventi relativi al PNC oggetto di definanziamento, nell' ipotesi di mancato perfezionamento delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, siano rese indisponibili le relative risorse.

Il quadro generale dei definanziamenti e rifinanziamenti è riportato in modo dettagliato nell'art. 1, comma 8 del DL 19/2024 laddove si prevede lo stanziamento delle ingenti risorse nazionali necessarie per la copertura finanziaria dei progetti definanziati ovvero parzialmente fuoriusciti dal PNRR.

Il 29 ottobre 2024, su richiesta del Governo, la Commissione ha assentito alcune ulteriori proposte di modifica al PNRR italiano, rispetto alla revisione più ampia dell'8

[9] la prima modifica, nel luglio 2023 è stata approvata dal Consiglio UE del 19 settembre 2023, ha riguardato milestones e targets (M&T). La seconda è stata richiesta dal Governo ad agosto 2023 e approvata dal Consiglio della UE l'8 dicembre 2023. La terza modifica, richiesta dal Governo il 4 marzo 2024 è stata approvata dal Consiglio della UE il 14 maggio 2024 (correzione di 55 errori materiali). La quarta modifica è stata richiesta dal Governo il 10 ottobre 2024 e approvata dal Consiglio della UE il 12 novembre 2024.
[10] La questione è diffusamente esaminata nella nota di lavoro 2/2024 – la riforma del codice dei contratti e la rimodulazione delPNRR – Ufficio parlamentare del bilancio, dicembre 2024.

dicembre 2023; le stesse sono state poi approvate dal Consiglio europeo il 18 novembre 2024. In seguito alla revisione del PNRR, alcune misure sono state dunque rimodulate, con la conseguenza che il finanziamento inizialmente programmato sui fondi del PNRR è stato sostituto da fondi statali o di altra fonte europea.

Con riferimento al precedente monitoraggio, di cui alla deliberazione n. 21/2024/GEST, l'Ente aveva evidenziato un possibile definanziamento per n. 95 CUP "*distribuiti sui 2 interventi dei Piani Urbani Integrati denominati Cambio e Spugna*". In sede istruttoria, questa Sezione chiedeva un aggiornamento in merito, anche a fronte della Tabella PNRR in cui i revisori hanno indicato solo n. 5 CUP passibili di definanziamento. Tuttavia nel suo riscontro istruttorio, la Città metropolitana di Milano ha dichiarato che nessuno dei CUP è stato oggetto di definanziamento.

3. TEMPI DI RIMBORSO DA PARTE DEI MINISTERI

La Sezione chiedeva all'Ente informazioni sullo stato della rendicontazione circa i rimborsi ricevuti dai ministeri. Dal riscontro istruttorio, l'Ente riferiva che i progetti effettivamente rendicontati risultavano essere solo n. 23 su n. 157 CUP, di cui si riporta in tabella il dettaglio.

Tabella 5 – Rimborsi

CUP	Codice Misura	Descrizione	PRG - Finanziamento PNRR (m€)	Importo totale rendicontato	Importo totale trasferito dal Ministero titolare	Tempo massimo di ritardo (numero di giorni) nei trasferimenti ministeriali
B81I21000020005	M5C2I2.03	CUP 5 - ID 101 CMM	200.000,00	192,71	-	N.D.
B85H21000210005	M5C2I2.04	CUP 4 - ID 101 CMM	4.800.000,00	4.636,68	-	N.D.
C41B21000070001	M5C2I2.05	CUP 6 - ID 103 CMM	300.453,00	291,59	-	N.D.
C41I21000020001	M5C2I2.06	CUP 4 - ID 103 CMM	1.140.669,50	1.101,92	-	N.D.
C41I21000030001	M5C2I2.07	CUP 5 - ID 103 CMM	1.119.969,50	1.084,26	-	N.D.
C91B21000060005	M5C2I2.08	CUP 15 - ID 103 CMM	1.016.885,00	982,41	-	N.D.
C95D21000020005	M5C2I2.09	CUP 13 - ID 103 CMM	746.594,00	721,57	-	N.D.
C97H21000140005	M5C2I2.10	CUP 16 - ID 103 CMM	178.379,00	172,41	-	N.D.
C99H21000000005	M5C2I2.11	CUP 14 - ID 103 CMM	1.958.143,00	1.890,91	-	N.D.
D25B18003230001	M5C2I2.12	CUP 7 - ID 103 CMM	1.466.084,00	1.400,68	-	N.D.
E34C21000000001	M5C2I2.13	CUP 6 - ID 101 CMM	5.000.000,00	4.830,83	-	N.D.
E38C20000320001	M5C2I2.14	CUP 1 - ID 101 CMM	2.250.000,00	2.173,48	-	N.D.
E38C20000330001	M5C2I2.15	CUP 3 - ID 101 CMM	500.000,00	482,53	-	N.D.
E38C20000340001	M5C2I2.16	CUP 2 - ID 101 CMM	2.250.000,00	2.173,48	-	N.D.
I41F22001870006	M5C2I2.17	1.4.4 CMM	14.000,00	600,00	-	N.D.
J41B21000170001	M5C2I2.18	CUP 10 - ID 103 CMM	670.000,00	647,67	-	N.D.
J41B21000180001	M5C2I2.19	CUP 11 - ID 103 CMM	440.000,00	424,56	-	N.D.
J43D21000000001	M5C2I2.20	CUP 12 - ID 103 CMM	77.500,00	75,28	-	N.D.

CUP	Codice Misura	Descrizione	PRG - Finanziamento PNRR (m€)	Importo totale rendicontato	Importo totale trasferito dal Ministero titolare	Tempo massimo di ritardo (numero di giorni) nei trasferimenti ministeriali
J47H21000220001	M5C2I2.21	CUP 8 - ID 103 CMM	1.250.000,00	1.210,09	-	N.D.
J47H21000230001	M5C2I2.22	CUP 9 - ID 103 CMM	1.150.000,00	1.111,37	-	N.D.
J81E21000060005	M5C2I2.23	CUP 2 - ID 103 CMM	1.002.774,00	969,35	-	N.D.
J81E21000070005	M5C2I2.24	CUP 3 - ID 103 CMM	518.461,00	501,36	-	N.D.
J81I21000010005	M5C2I2.25	CUP 1 - ID 103 CMM	1.963.593,00	1.904,28	-	N.D.
TOTALE			**30.013.505,00**	**29.579,42**		

Fonte: riscontro istruttorio prot. Cdc n. 23670 del 16 dicembre 2024

Dalla tabella risulta che su 30 milioni di finanziamento di PNRR riferiti ai n. 23 CUP rendicontati, la Città metropolitana ha inoltrato la rendicontazione per soli 29mila euro su cui non ha ricevuto alcun trasferimento ministeriale. Inoltre, dai dati trasmessi dall'Ente nel suo riscontro, emerge l'enorme lentezza nell'approvazione dei rendiconti da parte del Ministero: la rendicontazione inoltrata nel mese di ottobre 2023 è stata approvata dal Ministero dopo un anno, ovvero nel mese di ottobre 2024. Infine, risulta che, per l'unico CUP relativo al progetto *Lump Sum,* l'Ente è in attesa del rimborso dal Ministero, pari a 14mila euro corrispondente al finanziamento PNRR.

Dall'analisi dei dati relativi allo stato della rendicontazione, la Sezione ha potuto accertare una situazione particolarmente preoccupante, in quanto su n. 157 CUP finanziati con 250 milioni, la Città metropolitana ha finora inviato il rendiconto solo per n. 23 CUP (per un importo di 29mila euro), mentre per i restanti n. 131 CUP finanziati con 224 milioni, l'Ente non ha presentato ancora alcuna rendicontazione.

4. APPLICAZIONE DELLE NORME CONTABILI

In sede di contraddittorio cartolare, questa Sezione chiedeva di confermare il rispetto delle procedure di contabilizzazione applicate ai progetti finanziati con i fondi del PNRR e/o PNC, ai sensi dell'art. 15 (procedure finanziarie e contabili) del d.l. n. 77/2021 e del D.M. 11 ottobre 2021, con riferimento al Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) in relazione alle anticipazioni (come specificato nella FAQ n. 48/2021 della Ragioneria Generale dello Stato), nonché alla creazione di un capitolo di spesa per ciascun CUP (art. 3 del D.M. 11 ottobre 2021) e al tracciamento del flusso finanziario applicato alle singole transazioni in base alla propria struttura e organizzazione.
Nel riscontro istruttorio, l'Ente riferiva quanto segue.

4.1 Fondo pluriennale vincolato

Con riferimento alle anticipazioni ricevute sui fondi del PNRR (del 10 per cento prima e del 30 per cento poi), l'Ente ha riferito nel suo riscontro in merito che il FPV è stato attivato sulla base dell'accertamento delle anticipazioni nell'esercizio in cui erano previsti gli incassi e ne ha dettagliato il trattamento contabile. Sulle anticipazioni, l'Ente riferisce di avere applicato le norme contabili in relazione alla creazione di FPV di spesa e di entrata per traslare i fondi tra gli anni in successione. Quanto dichiarato dall'Ente non consente tuttavia una verifica, non avendo accesso ai piani gestionali dei singoli CUP, per questo la Sezione chiedeva ai revisori dell'Ente di certificare la correttezza del trattamento contabile sul punto.

4.2 Registrazione contabile

L'Ente, nel proprio riscontro istruttorio, ha confermato di aver provveduto a creare un capitolo di spesa per ogni CUP con l'eccezione dei progetti che rientrano nei due interventi PinQua per i quali, invece, sono stati creati due capitoli di spesa "*uno per ogni proposta ID101/ID103*".
Nella relazione del direttore del "settore pianificazione territoriale generale e rigenerazione urbana", a supporto di tale scelta si precisa che il programma PINQUA, inizialmente finanziato con fondi della legge di bilancio 2020, è stato successivamente integrato nel PNRR. Nel 2021, due delle tre proposte, presentate dalla Città metropolitana di Milano (D.M. Infrastrutture e mobilità sostenibile n.383 del 7 ottobre 2021), sono state ammesse a finanziamento, per un totale di circa 30 milioni di euro, destinati a 22 interventi in 8 comuni, per i quali "*in sede di variazione di assestamento del Bilancio di Previsione 2021-23, nel dicembre 2021 sono stati istituiti i capitoli di entrata e di spesa riferiti alle due proposte di cui sopra*".

A causa della difficoltà di contabilizzazione sono stati costituiti due capitoli di spesa, uno per ciascuna delle due proposte al fine di configurare "*una dimensione economica più aggregata in sede di bilancio, ma comunque disaggregata e tracciabile per singolo CUP negli atti di contabilizzazione …al fine di garantire la perimetrazione di cui all'art. 3 del D.M. 11 ottobre 2021 e alla successiva Circolare MEF n. 29 del 26/07/2022*". L'Ente rammenta che per questo intervento Città metropolitana agisce come soggetto attuatore di primo livello (essendo soggetto beneficiario dei fondi PNRR), mentre i comuni di secondo (in qualità di soggetti esecutori), con un meccanismo di rimborso per le spese sostenute dagli stessi. I comuni hanno l'obbligo di fornire la documentazione necessaria, in modo che Città metropolitana possa procedere "*a chiedere al MIT il rimborso, il cui importo transiterà sul bilancio della stessa prima di essere trasferito al soggetto attuatore di II° livello*". L'Ente rassicura, comunque, che il tracciamento finanziario della spesa per singolo CUP, con un sistema introdotto nel 2023 e implementato nel 2024, è garantito anche dai comuni, soggetti attuatori di secondo livello, e che per "*Città metropolitana di Milano è stato assicurato a livello di impegno di spesa e nei mandati di pagamento*". Inoltre, è stato implementato un sistema di tracciamento degli incassi e dei pagamenti, che permette di monitorare la situazione di cassa per ogni linea di intervento.

La Sezione prende atto di quanto dichiarato e raccomanda l'Ente di accertare che il sistema predisposto sia in linea con le linee guida del Ministero per evitare criticità in sede di rendicontazione dei fondi spesi.

5. SISTEMA DI MONITORAGGIO DEL COMUNE

5.1 La *governance* del PNRR

Nella deliberazione n. 21/2024/GEST, la Sezione rilevava come la *governance* del PNRR della Città metropolitana fosse articolata in due organismi con compiti distinti: una Segreteria tecnica con compiti di raccolta delle informazioni e monitoraggio sullo stato di attuazione del PNRR, ed una Cabina di regia, organo di governo e di indirizzo, che si rapporta direttamente all'organo politico. Per L'Ente tale organizzazione avrebbe dovuto essere funzionale per garantire "*la tempestività nell'attivazione di misure correttive in caso di inerzia o ritardi sul cronoprogramma*". In quella sede, si evidenziava che tale struttura di *governance* aveva assicurato "*il rispetto del cronoprogramma per oltre il 93 per cento dei progetti di cui Città metropolitana è soggetto attuatore, denotando un livello di efficacia sinora elevato nella gestione di questi progetti del PNRR*".
La Sezione, in sede istruttoria, chiedeva aggiornamenti, con particolare riguardo alla necessità di apportare correttivi al sistema dei controlli interni e/o della *governance*, e, nel caso, di motivare le ragioni del cambiamento rispetto all'assetto adottato all'inizio degli interventi.
Nel suo riscontro istruttorio, l'Ente dichiara che non è stato necessario apportare correttivi. Tuttavia, la Sezione rileva qualche criticità nella gestione dei progetti certificato dal fatto che l'avanzamento procedurale risulta fermo alla fase della stipula del progetto per circa l'80 per cento dei progetti e che allo stato risultano rendiconti solo per n. 23 dei n. 157 CUP, peraltro con importi decisamente inferiori rispetto ai finanziamenti totali. Il Collegio raccomanda dunque l'Ente di rafforzare la governance in particolare per i progetti di cui Città metropolitana è soggetto attuatore di I livello, mentre i comuni di II livello, avendo accertato un maggior ritardo sull'avanzamento procedurale di questi progetti.

5.2 Sistema dei controlli interni

I controlli interni rivestono un ruolo fondamentale per garantire trasparenza, efficienza e regolarità nell'attuazione dei procedimenti amministrativi, con particolare attenzione alla gestione delle risorse derivanti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dal Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC).
La Città metropolitana di Milano nel riscontro istruttorio riferisce che non è stato necessario modificare il sistema dei controlli interni, ma che, al fine di rafforzare la struttura, è in programmazione la pubblicazione di un bando per l'acquisizione del servizio "*Assistenza specialistica contabile e amministrativa per le attività di gestione, rendicontazione, revisione e validazione previste per gli interventi PNRR*".

La Sezione ricorda che questo tipo di controllo si configura come un elemento essenziale del sistema di gestione e controllo per garantire il rispetto delle normative e la corretta destinazione dei fondi pubblici. Attraverso questi controlli, infatti, l'Ente può monitorare l'efficacia delle procedure e la coerenza delle azioni rispetto agli obiettivi strategici. Un approccio che permette di intercettare eventuali criticità, correggerle tempestivamente e migliorare complessivamente la governance dei fondi europei e nazionali, assicurando che le risorse siano gestite con responsabilità e nell'interesse della collettività.

5.3 Amministrazione trasparente

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e comunicazione previsti dalla normativa vigente, la Città metropolitana di Milano dichiara che "*ai sensi della Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - n. 9 del 10 febbraio 2022, e alla Delibera ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023 (PNA 2022), in qualità di Soggetto attuatore di interventi PNRR, è tenuta ad assicurare la trasparenza degli atti, dati e informazioni relativi al PNRR mediante la pubblicazione degli stessi ai sensi del D.lgs. 33/2013*". Conferma, quindi, la pubblicazione degli atti, dati e informazioni sui progetti del PNRR "*a cura delle diverse Direzioni dell'Ente, nella sottosezione "Bandi di gara e contratti" della sezione "Amministrazione trasparente". Nella medesima sottosezione "Bandi di gara e contratti" è stato inserito il collegamento ipertestuale al sito tematico "PNRR - Piano Nazionale Ripresa e Resilienza" del sito web dell'Ente*".

6. CONTRADDITTORIO PUBBLICO

Questa Sezione, al termine dell'attività istruttoria cartolare ha ritenuto necessario approfondire alcuni aspetti, deferendo l'Ente in adunanza pubblica al fine di una valutazione ponderata da parte del Collegio sullo stato di attuazione degli interventi finanziati con fondi del PNRR e del PNC.
L'Ente ha fornito gli elementi richiesti sia con una memoria depositata il 10 marzo 2025 con prot. Cdc. n. 3173, sia con il contraddittorio avvenuto in adunanza.

Gli aspetti approfonditi sono stati:

1. Criticità nell'attuazione dei progetti, avendo riscontrato basse percentuali di pagamenti in particolare nella Missione 5 e di progetti (CUP), nonostante la presenza di un elevato numero di progetti "non nativi", che dovrebbero seguire un iter procedurale più spedito;
2. Carenza di personale, correttivi posti in essere dall'amministrazione:

- assunzioni a tempo determinato in particolare per due risorse all'interno dei progetti PinQua e per altre due, di cui una part-time, per i PUI "*Come in*" e "*Cambio*";
- protocollo di collaborazione con Regione Lombardia (decreto sindacale n.275/2024 del 31 ottobre 2024) al fine di ottenere un supporto tecnico operativo da parte degli esperti;
- procedura aperta per individuare un operatore economico qualificato a cui affidare il servizio di assistenza (gestione, rendicontazione, revisione ecc.).

In sede di contraddittorio, i rappresentanti dell'Ente, il Vicedirettore Generale Programmi di finanziamento europeo e il Direttore del Dipartimento della Ragioneria Generale, preliminarmente hanno voluto definire il perimetro dei progetti oggetto d'esame, comprendendo anche quelli di cui Città Metropolitana non risulta soggetto attuatore, ma solo beneficiario, laddove i finanziamenti previsti sono direttamente attribuiti dal Ministero dell'Interno ai comuni responsabili.

Per quanto riguarda il primo punto, relativo alla criticità emersa in sede di attuazione dei progetti, vengono riportati i dati di realizzazione dei CUP. In particolare, i n. 22 interventi finanziati dal programma PINQUA di cui i comuni dell'hinterland milanesi sono soggetti attuatori di 2° livello, risultavano alla data del 30 giugno 2024 secondo la tabella PNRR compilata dai revisori, in fase di "stipula del contratto". L'Ente ha spiegato che, sebbene n. 20 interventi fossero già in fase di esecuzione, sono stati classificati relativamente all'ultima fase conclusa, non essendo ancora terminata quella esecutiva. Di conseguenza, per questi progetti si rappresenta uno stato più avanzato di

realizzazione rispetto a quello evidenziato nella tabella stessa. Un ulteriore aspetto da evidenziare inerisce, infine, alla loro classificazione quali progetti "non nativi PNRR". Per questi, il finanziamento è stato confermato solo nel gennaio 2022, sebbene gli stessi siano stati avviati precedentemente. Il ritardo rilevato, pertanto, che ha comportato una sospensione delle procedure amministrative, è da collegare alla necessità di riallinearli ai meccanismi del PNRR,.

Per quanto riguarda lo stato di attuazione dei "Progetti Urbani Integrati", i rappresentanti dell'Ente riferiscono che, per il progetto "Spugna", finalizzato al miglioramento della capacità di drenaggio del territorio con interventi innovativi di ingegneria naturalistica, la realizzazione è stata programmata in tre blocchi per scaglionare l'avvio dei cantieri. Attualmente, a fronte di una percentuale relativamente bassa di interventi completati con certificato di fine lavori, la maggioranza dei cantieri è già attiva, mentre per la parte residuale dei progetti è programmata l'apertura dei cantieri tra il mese di marzo 2025 e il mese di gennaio 2026. Per il progetto "Cambio", finalizzato alla realizzazione di grandi itinerari ciclabili sovracomunali, tutti i cantieri sono aperti e in fase di esecuzione.

In merito, invece, all'andamento finanziario ed alla rendicontazione degli interventi, i finanziamenti vengono erogati con anticipi del 30 per cento e successivamente rendicontati. A seguito del decreto del MEF del 6 dicembre 2024, i rappresentanti dell'Ente hanno riferito che dal Ministero è stato richiesto, con l'obiettivo di velocizzare il flusso finanziario, di attingere prima al 30 per cento dei fondi in anticipazione e di presentare dopo i rendiconti, la cui validazione avverrà in fase di saldo finale. Di conseguenza, Città Metropolitana procede con la richiesta di pagamenti intermedi fino al 90 per cento del CUP (attestando con una autocertificazione l'avanzamento finanziario), facendo slittare la rendicontazione vera e propria alla fase del saldo finale. Questa modalità, di fatto, ha rallentato le rendicontazioni, ma era necessaria per evitare i lunghi tempi di validazione dei rimborsi da parte del Ministero. In conclusione, emerge un ritardo nell'attività di rendicontazione indotta dalla richiesta del Ministero.

Con riferimento al secondo punto rilevato, si conferma il problema strutturale che riguarda la carenza di personale per la gestione del PNRR e dei CUP. Regione Lombardia ha ricevuto risorse PNRR per l'assunzione di esperti, che tuttavia non sono destinati a supportare direttamente gli enti beneficiari di fondi PNRR, bensì a semplificare i processi amministrativi in generale. Di conseguenza, Città Metropolitana ha stipulato un accordo con la Regione nell'estate 2024 per ottenere un supporto in alcuni procedimenti, anche se le competenze professionali offerte non risultano sempre adeguate. Si è proceduto ad assunzioni di unità a tempo determinato finanziate all'interno del quadro economico dei CUP; inoltre, l'Ente ha ritenuto necessario ottenere la collaborazione di un soggetto specializzato che possa supportare nella fase

del monitoraggio e della rendicontazione da un punto di vista procedimentale e finanziario oltre a quello della valutazione dei progetti (misurazione della *performance* finalizzata a conseguire i target).

7. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Alla luce dell'attività istruttoria di questa Sezione, sulla base delle informazioni contenute nella Tabella PNRR compilata dai revisori dell'Ente allegata al Questionario sul bilancio di previsione 2024-2026 (che contiene informazioni circa i dati di bilancio al 31 dicembre 2023 e sullo stato di avanzamento dei progetti al 30 giugno 2024) e della piattaforma ReGiS consultata in data 30 gennaio 2025, oltre a quanto emerso in sede di adunanza pubblica e nella memoria depositata, si possono formulare le seguenti conclusioni:

1. Città metropolitana di Milano risulta **soggetto attuatore di n. 157 interventi**, che corrispondono ad altrettanti CUP (Codice Unico di Progetto), di cui n. 50 progetti "*non nativi PNRR*", ovvero la cui origine precede il PNRR e che sono stati poi inseriti nel piano;
2. per la realizzazione di questi progetti l'Ente risulta **beneficiario di 222,5 milioni tra PNRR e PNC** (213,4 milioni PNRR e 9 milioni PNC) a cui occorre aggiungere altri fondi pubblici per un importo complessivo di 293,4 milioni. I fondi del PNRR costituiscono il 73 per cento circa del totale, le risorse del PNC sono pari al 3 per cento, il FOI circa l'8 per cento e i fondi statali il 13 per cento; il resto sono fondi propri o dei comuni (soggetti esecutori);
3. per quanto concerne **l'avanzamento procedurale**, dai dati dei revisori al 30 giugno 2024 risultava che il 76 per cento dei progetti era nella fase di stipula del contratto, il 17 per cento dei progetti in esecuzione e solo il 2,5 per cento (n.4 progetti) in fase di collaudo e dunque quasi completati; tuttavia da un controllo su ReGiS, solo un ulteriore progetto nella Missione 5 risulta concluso al 30 gennaio 2025, mostrando dunque un progresso di poco conto rispetto alla situazione rilevata al 30 giugno 2024. Dall'attività di monitoraggio è emersa una percentuale di progetti conclusi molto bassa (5 su 157), tenuto conto dell'elevato numero di progetti "non nativi", che dovrebbero seguire un iter procedurale più spedito essendo stati approvati prima dell'avvento del PNRR. In sede di adunanza pubblica e nella memoria depositata Città metropolitana ha spiegato come i progetti "non nativi" abbiano dovuto scontare un ritardo procedurale in fase di inserimento nel PNRR;
4. nell'intervento M5C2I2.03-Programma innovativo della qualità dell'abitare (PInQuA) vi sono **n.22 progetti di cui i comuni dell'hinterland milanese sono soggetti esecutori** (soggetti attuatori di 2° livello), mentre l'Ente è soggetto beneficiario. Su questi la Sezione si era espressa nella precedente deliberazione raccomandando all'Ente di monitorare lo stato di attuazione in quanto era stata accertata una percentuale maggiore di progetti in una fase procedurale più arretrata rispetto alla maggior parte del resto dei progetti. In effetti, al 30 giugno 2024 questi progetti risultavano tutti ancora in fase di "stipula contratto", nonostante si

trovassero per la maggior parte già nella fase più avanzata di esecuzione, per una erronea interpretazione in sede di compilazione nella Tabella PNRR;

5. al 30 giugno 2024 risultavano **in ritardo rispetto al cronoprogramma** 10 progetti dell'intervento M5C2I2.02-Piani urbani integrati (PUI13 Città metropolitana Spugna): su richiesta della Sezione l'Ente ha dichiarato che per 7 di questi occorreva attendere il periodo idoneo per completare la piantumazione anche se la criticità era in via di risoluzione, mentre per gli altri era stata superata; nell'adunanza pubblica l'Ente ha spiegato come questo intervento richieda una programmazione dei cantieri in successione temporale, rassicurando sul rispetto del cronoprogramma;
6. tra le **criticità riscontrate nell'attuazione** l'Ente segnalava la carenza di personale, in particolare sui profili tecnico/specialistici ed economico/finanziari, riguardante tutti i progetti; per risolvere la criticità l'Ente è ricorso a 4 assunzioni a TD e bandito una posizione per assistente nella gestione e rendicontazione degli interventi PNRR, oltre ad aver firmato un protocollo ad ottobre 2024 per aiuto da parte degli esperti di Regione Lombardia sulle procedure complesse;
7. per quanto concerne l'**avanzamento finanziario**, risulta una percentuale dell'84 per cento dell'impegnato complessivo sui fondi totali, con minime differenze tra le varie missioni. Per quanto riguarda invece i pagamenti in relazione agli impegni si osserva una percentuale del 36,4 per cento a denotare un'inerzia nei pagamenti: tale inerzia è più accentuata nei progetti della Missione 5 dove la percentuale è pari al 29 per cento, così come nelle missioni 2 e 4 dove i pagamenti non superano il 50 per cento degli impegni;
8. a fronte di **anticipazioni** pari al 14 per cento circa del totale dei fondi, su tutti i CUP della Missione 5 e di gran parte della Missione 4, il totale dei pagamenti a valere sulle risorse PNRR (pari a 26 milioni) risulta complessivamente inferiore rispetto all'anticipazione ricevuta (pari a 33 milioni). E' di tutta evidenza come la lentezza nel completamento degli interventi, dopo le spiegazioni fornite dall'Ente in adunanza, non dipenda dalla mancanza di risorse finanziarie;
9. con riferimento ad un possibile **definanziamento** per n. 95 CUP "*distribuiti sui 2 interventi dei Piani Urbani Integrati denominati Cambio e Spugna*" emerso nel precedente monitoraggio, l'Ente ha dichiarato nel suo riscontro che nessuno dei CUP è stato oggetto di definanziamento;
10. per quanto concerne la **rendicontazione**, la Sezione ha potuto verificare che su n. 157 CUP finanziati con 250 milioni, l'Ente ha finora inviato il rendiconto solo per n. 23 CUP (per un importo di 29mila euro), mentre per i restanti n. 131 CUP finanziati con 224 milioni, l'Ente non ha presentato ancora alcuna rendicontazione; in sede di adunanza pubblica Città metropolitana ha illustrato le ragioni per cui, pur non

procedendo speditamente con la rendicontazione, i progetti sono per la maggior parte in esecuzione e in linea col cronoprogramma;

11. l'Ente, nel proprio riscontro istruttorio, conferma di attenersi alle **norme contabili** e di aver provveduto a creare un capitolo di spesa per ogni CUP con l'eccezione dei progetti che rientrano nei due interventi PInQuA (con i Comuni soggetti attuatori di 2° livello) per i quali, invece, sono stati creati due capitoli di spesa "*uno per ogni proposta ID101/ID103*" per le difficoltà di contabilizzazione. La Sezione prende atto di quanto dichiarato circa la piena tracciabilità dei flussi finanziari, ma raccomanda l'Ente di accertare che il sistema predisposto sia in linea con le linee guida del Ministero per evitare criticità in sede di rendicontazione dei fondi spesi;
12. nonostante l'Ente dichiari di non aver ritenuto necessario apportare correttivi alla *governance*, si sono rilevate criticità nella gestione dei progetti date dalla lentezza nel completamento dei progetti attestato dal fatto che solo per il 15 per cento dei CUP sono state rendicontate risorse, peraltro con importi decisamente inferiori rispetto ai finanziamenti totali. In adunanza Città metropolitana ha spiegato le ragioni per cui si procede a rilento con la rendicontazione. Nonostante la complessità burocratica riscontrata e la carenza di personale, l'Ente ha dichiarato di poter rispettare il cronoprogramma e di predisporre contromisure per garantire il completamento dei progetti.

Tabella 6 - Elenco dettagliato per CUP dei progetti per stato di attuazione

N	INTERVENTO	CUP	DESCRIZIONE	FASE PROCEDURALE (da Tabella PNRR al 30 giugno 2024)	cronoprogramma rispettato (da Tabella PNRR al 30 giugno 2024)	CONCLUSO/IN CORSO (da ReGiS al 30 gennaio 2025)	Flag progetti in essere
1	M1C1I1.04-Servizi digitali e esperienza dei cittadini	I41F22001870006	1.4.4cmmicitta' metropolitana di milano	Collaudo/Certificato di regolare esecuzione	Termini rispettati	In Corso	No
2	M1C1I1.04-Servizi digitali e esperienza dei cittadini	I54F23000060006		Stipula contratto	Termini rispettati		
3	M2C3I1.01-Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	I41B22000220006	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SEDE SUCCURSALE ISTITUTO P FRISI VIA AMORETTI 6163 MILANO	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	Sì
4	M2C4I3.1	I32F23000440001	INCREMENTARE IL CAPITALE NATURALE PER RAFFORZARE LA RETE ECOLOGICA TERRITORIALE CMMI 1	n.d.		In Corso	No
5	M2C4I3.1	I52F23000320001	LA FORESTAZIONE URBANA PER MITIGARE L'ISOLA DI CALORE – CMMi 2	n.d.		In Corso	No
6	M4C1I1.03-Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola	I41B22000440006	COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA A SERVIZIO DELLA SUCCURSALE DI VIA BEATRICE DESTE DEL LICEO REBORA DI RHO CUP I41B22000440006	Stipula contratto	Termini NON rispettati	In Corso	Sì
7	M4C1I1.03-Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola	I44D22003010001	SOSTITUZIONE SERRAMENTI PRESSO LISTITUTO LEONARDO DA VINCI DI VIA RESPIGHI 7 A MILANO	Aggiudicazione	Termini rispettati	In Corso	Sì
8	M4C1I1.03-Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola	I44D22003020001	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI DEGLI ISTITUTI VITTORIO VENETO ED ETTORE CONTI IN VIA DEVINCENTI A MILANO ATTRAVERSO I	Aggiudicazione	Termini rispettati	In Corso	Sì
9	M4C1I1.03-Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola	I44D22003030001	INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGICO PRESSO LISTITUTO SCHIAPPARELLI GRAMSCI VIA SETTEMBRINI 4 MIL	Aggiudicazione	Termini rispettati	In Corso	Sì

N	INTERVENTO	CUP	DESCRIZIONE	FASE PROCEDURALE (da Tabella PNRR al 30 giugno 2024)	cronoprogramma rispettato (da Tabella PNRR al 30 giugno 2024)	CONCLUSO/IN CORSO (da ReGiS al 30 gennaio 2025)	Flag progetti in essere
10	M4C1I1.03-Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola	I44D22003040006	INTERVENTO ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZINA C ISTITUTO PARETO MILANO	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	Sì
11	M4C1I1.03-Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola	I45F22000120006	RIQUALIFICAZIONE AREA SPORTIVA ESTERNA CENTRO SCOLASTICO PUECHER DI VIA ULISSE DINI MILANO CUP I45F22000120006	Aggiudicazione	Termini rispettati	In Corso	Sì
12	M4C1I1.03-Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola	I55F22000390006	LAVORI DI RIQUALIFICA ARCHITETTONICA E FUNZIONALE DELLE PALESTRE DEL CENTRO SCOLASTICO DI SAN DONATO MILANESE MI VIA MARTIRI DI	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	No
13	M4C1I1.03-Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola	I71B22000310006	REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA PRESSO IL LICEO GIORDANO BRUNO SUCCURSALE DI VIA PAPA GIOVANNI XXIII N 110 CASSANO DADDA MILANO CUP	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	Sì
14	M4C1I3.03-Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	I22E16000080001	NUOVO CORPO AULE PRESSO IL LA FONTANA DI ARESE MI	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	Sì
15	M4C1I3.03-Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	I28B20000190001	RIFACIMENTO COPERTURE ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI PRESSO IL LS FALCONE BORSELLINO VIA MATTEOTTI29 DI ARESE MI	Esecuzione	Termini rispettati	In Corso	Sì
16	M4C1I3.03-Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	I37H18002270001	RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO ISIS IPSIA BERNOCCHI LEGNANO	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	Sì

N	INTERVENTO	CUP	DESCRIZIONE	FASE PROCEDURALE (da Tabella PNRR al 30 giugno 2024)	cronoprogramma rispettato (da Tabella PNRR al 30 giugno 2024)	CONCLUSO/IN CORSO (da ReGiS al 30 gennaio 2025)	Flag progetti in essere
17	M4C1I3.03-Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	I38B20000120001	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA PALESTRA ATTUALMENTE DESTINATA A MAGAZZINO DA RIQUALIFICAR	Esecuzione	Termini rispettati	In Corso	Sì
18	M4C1I3.03-Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	I38B20000130001	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DEL LABORATORIO DI TORNERIA DA CONVERTIRE IN AULE DIDATTICHE POL	Esecuzione	Termini rispettati	In Corso	Sì
19	M4C1I3.03-Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	I38B20000460001	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO 1 LOTTO MESSA IN SICUREZZA DELLE FAC	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	Sì
20	M4C1I3.03-Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	I43D22000550006	LAVORI DI RIQUALIFICA ARCHITETTONICA E FUNZIONALE DELLA MENSA PRESSO LEDUCANDATO SETTI CARRARO VIA PASSIONE 12 MILANO	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	No
21	M4C1I3.03-Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	I43G16000420003	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI METROPOLITANI ZONA ABCDE MEDIANTE LUSO DI MATERIA	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	Sì
22	M4C1I3.03-Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	I45H18000540001	ISTITUTI GIORGI E ORIANIMAZZINI DI MILANO LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL PLESSO SCOLASTICO	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	Sì
23	M4C1I3.03-Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	I45H18000550001	COSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO PER LA REALIZZAZIONE DI AULE DIDATTICHE ED AULA MAGNA	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	Sì

N	INTERVENTO	CUP	DESCRIZIONE	FASE PROCEDURALE (da Tabella PNRR al 30 giugno 2024)	cronoprogramma rispettato (da Tabella PNRR al 30 giugno 2024)	CONCLUSO/IN CORSO (da ReGiS al 30 gennaio 2025)	Flag progetti in essere
			PRESSO LISTITUTO SCOLASTICO RUSSEL DI VIA				
24	M4C1I3.03-Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	I45H18000560001	ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO NUOVA EDIFICAZIONE CORPO AULE E PALESTRA	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	Sì
25	M4C1I3.03-Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	I47H18002070005	LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI PRESSO ITCPA VERRI VIA LATTANZIO 38 MILANO	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	Sì
26	M4C1I3.03-Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	I47H20003430001	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA CORPO AULE CORPO PALESTRA E CORPO LABORATORI PRESSO LIPS	Collaudo/Certificato di regolare esecuzione	Termini rispettati	In Corso	Sì
27	M4C1I3.03-Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	I48B18000140009	LAVORI NECESSARI PER LADEGUAMENTO NORMATIVO E LOTTENIMENTO DEL CPI DEL LC REBORA VIA PAPA GIOVANNI XXIII A RHO MI	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	Sì
28	M4C1I3.03-Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	I48B18000160001	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE SPAZI DIDATTICI PER INSERIMENTO SUCCURSALESEDE COORDINATA LC REBORA	Collaudo/Certificato di regolare esecuzione	Termini rispettati	In Corso	Sì
29	M4C1I3.03-Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	I48B18000200001	ITI FELTRINELLI COMPLETAMENTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA CORPO CAPANNONI LABORATORI 2 LOTTO 2 STRALCIO	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	Sì
30	M4C1I3.03-Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	I48B19000000009	SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E RIPRISTINO FACCIATE 1 LOTTO	Esecuzione	Termini rispettati	In Corso	Sì

N	INTERVENTO	CUP	DESCRIZIONE	FASE PROCEDURALE (da Tabella PNRR al 30 giugno 2024)	cronoprogramma rispettato (da Tabella PNRR al 30 giugno 2024)	CONCLUSO/IN CORSO (da ReGiS al 30 gennaio 2025)	Flag progetti in essere
31	M4C1I3.03-Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	I48B19000010009	INTERVENTO DI CONTROSOFFITTATURA E MESSA IN SICUREZZA SFONDELLAMENTO SOLAI II LOTTO	Collaudo/Certificato di regolare esecuzione	Termini rispettati	In Corso	Sì
32	M4C1I3.03-Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	I48B20000200001	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DEL LABORATORIO DI ELETTRONICA DA TRASFORMARE IN AULE IL RIFACIM	Esecuzione	Termini rispettati	In Corso	Sì
33	M4C1I3.03-Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	I48B20000280001	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INERENTI LA REVISIONE E RICORSA DEI COPPI DELLA COPERTURA PRESSO LEDUCANDATO STATALE EMANUE	Esecuzione	Termini rispettati	In Corso	Sì
34	M4C1I3.03-Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	I51D20000260001	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTOVENTILAZIONE PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI	Aggiudicazione	Termini rispettati	In Corso	Sì
35	M4C1I3.03-Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	I57J20000000001	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DI CITTA METROPOLITANA DI MILANO DA AFFIDARE MED	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	Sì
36	M4C1I3.03-Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	I58B20000300001	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI AGLI IMPIANTI TECNOLOGICI PER LACCESSIBILITA NELLE SCUOLE SUPERIORI	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	Sì
37	M4C1I3.03-Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	I68B20000160001	FORNITURA E POSA DI NUOVI INFISSI DA COLLOCARE NELLE AULE AL FINE DI ASSICURARE IL RICAMBIO DARIA E	Esecuzione	Termini NON rispettati	In Corso	Sì

N	INTERVENTO	CUP	DESCRIZIONE	FASE PROCEDURALE (da Tabella PNRR al 30 giugno 2024)	cronoprogramma rispettato (da Tabella PNRR al 30 giugno 2024)	CONCLUSO/IN CORSO (da ReGiS al 30 gennaio 2025)	Flag progetti in essere
			RISANAMENTO AMBIENTI ULTIMO				
38	M4C1I3.03-Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	I69J21000980001	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEI CENTRI SCOLASTICI GALLARATESE	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	Sì
39	M4C1I3.03-Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	I88B20000240001	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE E DEI BLOCCHI BAGNI DELLE PALESTRE DELLIIS MAGGIOLINI DI PARABIAGO MI	Esecuzione	Termini rispettati	In Corso	Sì
40	M4C1I3.03-Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	I98B20000230001	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO LIPSIA MAJORANA VIA VOLTA 11 A CERNUSCO SN MI 2LOTTO	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	Sì
41	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	I18E22000020001	SPUGNA - MARCALLO CON CASONE - ALLEGGERIMENTO VIA MANZONI	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	No
42	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	I18E22000030001	SPUGNA - ROSATE ALLEGGERIMENTO VIA DON G. COLOMBO	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	No
43	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	I18E22000040001	SPUGNA - ROSATE - ALLEGGERIMENTO VIA DE GASPERI/VERGA	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	No
44	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	I18E22000050001	SPUGNA - ROSATE - ALLEGGERIMENTO VIA DUSE	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	No
45	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	I28E22000010001	SPUGNA - BOLLATE - DISCONNESSIONE VIA DANTE STRADA DI ACCESSO AL CENTRO SPORTIVO	Esecuzione	Dato Mancante	In Corso	No
46	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	I28E22000020001	SPUGNA - BOLLATE - DISCONNESSIONE VIA GIANDOMENICO ROMAGNOSI	Esecuzione	Dato Mancante	In Corso	No

N	INTERVENTO	CUP	DESCRIZIONE	FASE PROCEDURALE (da Tabella PNRR al 30 giugno 2024)	cronoprogramma rispettato (da Tabella PNRR al 30 giugno 2024)	CONCLUSO/IN CORSO (da ReGiS al 30 gennaio 2025)	Flag progetti in essere
47	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	I28E22000030001	SPUGNA - BOLLATE - DISCONNESSIONE PIAZZA DELLA RESISTENZA	Esecuzione	Dato Mancante	In Corso	No
48	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	I28E22000040001	SPUGNA - BOLLATE - DISCONNESSIONE VIA CADUTI BOLLATESI.	Esecuzione	Dato Mancante	In Corso	No
49	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	I28E22000050001	SPUGNA - COLOGNO MONZESE - DISCONNESSIONE VIA CESARE BATTISTI COLOGNO MONZESE	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	No
50	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	I28E22000060001	SPUGNA - COLOGNO MONZESE - RIQUALIFICAZIONE VIA LUIGI GALVANI COLOGNO MONZESE	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	No
51	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	I28E22000070001	SPUGNA - COLOGNO MONZESE - DISCONNESSIONE DI VIA SANTA MARIA	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	No
52	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	I28E22000080001	SPUGNA - COLOGNO MONZESE - ALLEGGERIMENTO PARCHEGGIO VIA VOLTA	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	No
53	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	I28E22000090001	SPUGNA - COLOGNO MONZESE - ALLEGGERIMENTO PARCHEGGIO VIA VISCONTI	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	No
54	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	I28E22000100001	SPUGNA - COLOGNO MONZESE - ALLEGGERIMENTO PARCHEGGIO VIA TOTI	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	No
55	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	I28E22000110001	SPUGNA - COLOGNO MONZESE - DISCONNESSIONE DI PARCHEGGIO CENTRALE COLOGNO MONZESE	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	No

N	INTERVENTO	CUP	DESCRIZIONE	FASE PROCEDURALE (da Tabella PNRR al 30 giugno 2024)	cronoprogramma rispettato (da Tabella PNRR al 30 giugno 2024)	CONCLUSO/IN CORSO (da ReGiS al 30 gennaio 2025)	Flag progetti in essere
56	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	I31B22000900001	LINEA RADIALE 15 ZONA OMOGENEA NORD OVEST E ALTO MILANESE LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL BICIPLAN METROPOLITANO CAMBIO - LINEA 15	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	No
57	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	I31B22000910001	LINEA RADIALE 7 ZONA OMOGENEA SUD-EST LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL BICIPLAN METROPOLITANO CAMBIO - LINEA 7	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	No
58	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	I38E22000020001	SPUGNA - ARLUNO - ALLEGGERIMENTO PIAZZA DE GASPERI	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	No
59	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	I38E22000030001	SPUGNA - CANEGRATE DISCONNESSIONE VIA 24	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	No
60	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	I38E22000040001	SPUGNA - CANEGRATE - DISCONNESSIONE VIA	Esecuzione	Termini rispettati	In Corso	No
61	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	I38E22000050001	SPUGNA - LEGNANO - DISCONNESSIONE PIAZZA TRENTO TRIESTE	Esecuzione	Dato Mancante	In Corso	No
62	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	I38E22000060001	SPUGNA - LEGNANO - DISCONNESS	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	No
63	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	I38E22000070001	SPUGNA - LEGNANO - DISCONNESSIONE VIA MATTEOTTI	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	No
64	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	I38E22000080001	SPUGNA - LEGNANO - DISCONNESSIONE VIA ROSSINI	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	No
65	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	I38E22000090001	SPUGNA - LEGNANO - DISCONNESSIONE CORSO MAGENTA	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	No
66	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	I38E22000100001	SPUGNA - LEGNANO - DISCONNESSIONE VIA PODGORA	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	No
67	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	I38E22000110001	SPUGNA - TURBIGO - RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DEGLI ARTIGIANI	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	No

N	INTERVENTO	CUP	DESCRIZIONE	FASE PROCEDURALE (da Tabella PNRR al 30 giugno 2024)	cronoprogramma rispettato (da Tabella PNRR al 30 giugno 2024)	CONCLUSO/IN CORSO (da ReGiS al 30 gennaio 2025)	Flag progetti in essere
68	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	I41B22000550001	LINEA RADIALE 5 ZONA OMOGENEA ADDA MARTESANA LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL BICIPLAN METROPOLITANO CAMBIO - LINEA 5	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	No
69	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	I41B22000560001	LINEA RADIALE 2 ZONA OMOGENEA NORD MILANO LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL BICIPLAN METROPOLITANO CAMBIO - LINEA 2	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	No
70	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	I48E22000020001	SPUGNA - ASSAGO - DISCONNESSIONE VIA MATTEOTTI - PARCHEGGIO TRA CIVICO 14 E 16	Esecuzione	Termini rispettati	In Corso	No
71	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	I48E22000030001	SPUGNA - ASSAGO - DISCONNESSIONE VIA MATTEOTTI - FRONTE CIVICO 18	Esecuzione	Termini rispettati	In Corso	No
72	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	I48E22000040001	SPUGNA - ASSAGO - DISCONNESSIONE VIA MATTEOTTI TRATTO TRA IL CIVICO 16 E 18	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	No
73	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	I48E22000050001	SPUGNA - ASSAGO - ALLEGGERIMENTO VIA 1 MAGGIO	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	No
74	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	I48E22000060001	SPUGNA - ASSAGO - DISCONNESSIONE VIA ROMA - IN PROSSIMITA' DEL CIMITERO	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	No
75	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	I48E22000070001	SPUGNA - ASSAGO - DISCONNESSIONE VIA TOGLIATTI	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	No
76	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	I48E22000080001	SPUGNA - BUSCATE DISCONNESSIONE VIA EDISON	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	No
77	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	I48E22000090001	SPUGNA - BUSCATE DISCONNESSIONE VIA DELL'INDUSTRIA	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	No
78	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	I48E22000100001	SPUGNA - BUSCATE DISCONNESSIONE VIA PRIMO MAGGIO - VIA SAN PIETRO	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	No

N	INTERVENTO	CUP	DESCRIZIONE	FASE PROCEDURALE (da Tabella PNRR al 30 giugno 2024)	cronoprogramma rispettato (da Tabella PNRR al 30 giugno 2024)	CONCLUSO/IN CORSO (da ReGiS al 30 gennaio 2025)	Flag progetti in essere
79	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	I48E22000110001	SPUGNA - BUSCATE DISCONNESSIONE PIAZZA UNITA' D'ITALIA (PIAZZA DEL MERCATO)	Esecuzione	Dato Mancante	In Corso	No
80	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	I48E22000120001	SPUGNA - CESANO BOSCONE - DISCONNESSIONE INCROCIO VIA ROMA-VIA DANTE-VIA LIBERTA' PARCHEGGIO PARCO BORSELLINO	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	No
81	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	I48E22000130001	SPUGNA - CESANO BOSCONE - DISCONNESSIONE VIA DELLE ACACIE	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	No
82	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	I48E22000140001	SPUGNA - PIEVE EMANUELE - DISCONNESSIONE PIAZZA ALLENDE	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	No
83	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	I48E22000150001	SPUGNA - PIEVE EMANUELE - DISCONNESSIONE VIA DEI PINI (FRONTE SCUOLA)	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	No
84	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	I48E22000160002	SPUGNA - PIEVE EMANUELE - DISCONNESSIONE VIA DEI PINI-VIA DEI GELSI	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	No
85	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	I48E22000170001	SPUGNA - RHO - DISCONNESSIONE VIA ALDO MORO	Esecuzione	Termini rispettati	In Corso	No
86	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	I48E22000180001	SPUGNA - RHO - DISCONNESSIONE VIA LABRIOLA	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	No
87	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	I48E22000200001	SPUGNA - SESTO SAN GIOVANNI - DISCONNESSIONE VIA CASIRAGHI MONTEGRAPPA	Esecuzione	Dato Mancante	In Corso	No
88	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	I48E22000210001	SPUGNA - SESTO SAN GIOVANNI - DISCONNESSIONE VIA CARDUCCI - CLERICI (AREA INTERNA AL PERIMETRO DEL PARCO REGIONALE PARCO NORD)	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	No
89	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	I48E22000230001	SPUGNA - SESTO SAN GIOVANNI - ALLEGGERIMENTO VIA PADOVANI	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	No
90	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	I48E22000240001	SPUGNA - RHO DISCONNESSIONE VICOLO SECCHI	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	No

N	INTERVENTO	CUP	DESCRIZIONE	FASE PROCEDURALE (da Tabella PNRR al 30 giugno 2024)	cronoprogramma rispettato (da Tabella PNRR al 30 giugno 2024)	CONCLUSO/IN CORSO (da ReGiS al 30 gennaio 2025)	Flag progetti in essere
91	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	I48E22000250001	SPUGNA - SESTO SAN GIOVANNI - DISCONNESSIONE VIA PASOLINI	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	No
92	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	I48E22000270001	SPUGNA - SESTO SAN GIOVANNI - ALLEGGERIMENTO VIALE MATTEOTTI	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	No
93	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	I48E22000280001	SPUGNA - RHO - DISCONNESSIONE VIA ZARA	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	No
94	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	I48E22000290001	SPUGNA - RHO - DISCONNESSIONE VIA REDIPUGLIA	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	No
95	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	I48E22000300001	SPUGNA - SESTO SAN GIOVANNI - ALLEGGERIMENTO PARCHEGGIO GRANELLI	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	No
96	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	I48E22000310001	SPUGNA - RHO - DISCONNESSIONE CORSO EUROPA - SERRA - BERSAGLIO	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	No
97	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	I48E22000320001	SPUGNA - RHO - DISCONNESSIONE VIA CORNAGGIA	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	No
98	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	I48E22000330001	SPUGNA - RHO - DISCONNESSIONE VIA NENNI.	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	No
99	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	I48E22000340001	SPUGNA - RHO - DISCONNESSIONE VIA. CARDINAL FERRARI - CONCILIAZIONE	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	No
100	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	I48E22000350001	SPUGNA - RHO DISCONNESSIONE VIA MOSCOVA	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	No
101	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	I48E22000360001	SPUGNA - RHO DISCONNESSIONE VIA MONTENEVOSO	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	No
102	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	I58E22000010001	SPUGNA - CORSICO - ALLEGGERIMENTO VIALE DELLA LIBERAZIONE-VIA MATTEOTTI	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	No
103	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	I58E22000020001	SPUGNA - SAN VITTORE OLONA - ALLEGGERIMENTO VIA XXIV MAGGIO	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	No
104	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	I68E22000010001	SPUGNA - CESATE - RIQUALIFICAZIONE PIAZZA IV NOVEMBRE	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	No

N	INTERVENTO	CUP	DESCRIZIONE	FASE PROCEDURALE (da Tabella PNRR al 30 giugno 2024)	cronoprogramma rispettato (da Tabella PNRR al 30 giugno 2024)	CONCLUSO/IN CORSO (da ReGiS al 30 gennaio 2025)	Flag progetti in essere
105	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	I68E22000020001	SPUGNA - PADERNO DUGNANO - ALLEGGERIMENTO VIA SERRA-PADERNO DUGNANO	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	No
106	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	I68E22000030001	SPUGNA - TREZZANO SUL NAVIGLIO - ALLEGGERIMENTO VIA PRATI	Esecuzione	Termini rispettati	In Corso	No
107	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	I68E22000040001	SPUGNA - TREZZANO SUL NAVIGLIO - DISCONNESSIONE VIA CONCORDIA - VIA GIOIA	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	No
108	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	I78E22000020001	SPUGNA - BRESSO - DISCONNESSIONE VIA DEL MOLINO	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	No
109	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	I78E22000030001	SPUGNA - BRESSO ALLEGGERIMENTO VIA ARCHIMEDE	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	No
110	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	I78E22000040001	SPUGNA - CINISELLO BALSAMO RIQUALIFICAZIONE AD AREA MULTISPORT IN VIA TUROLDO	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	No
111	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	I78E22000050001	SPUGNA - CORMANO - ALLEGGERIMENTO VIA BRODOLINI - DEI BRAVI	Esecuzione	Termini rispettati	In Corso	No
112	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	I78E22000060001	SPUGNA - CORMANO - ALLEGGERIMENTO VIA G. BRODOLINI	Esecuzione	Dato Mancante	In Corso	No
113	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	I78E22000070001	SPUGNA - MELEGNANO - DISCONNESSIONE DI PIAZZA FRANCESCO BIANCHI	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	No
114	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	I78E22000080001	SPUGNA - SAN GIORGIO SU LEGNANO - DISCONNESSIONE PIAZZALE DELLA COSTITUZIONE (AREA MERCATO DI VIA ALDO MORO)	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	No
115	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	I78E22000090001	SPUGNA - SAN GIORGIO SU LEGNANO - DISCONNESSIONE VIA CAMPACCIO	Esecuzione	Termini rispettati	In Corso	No

N	INTERVENTO	CUP	DESCRIZIONE	FASE PROCEDURALE (da Tabella PNRR al 30 giugno 2024)	cronoprogramma rispettato (da Tabella PNRR al 30 giugno 2024)	CONCLUSO/IN CORSO (da ReGiS al 30 gennaio 2025)	Flag progetti in essere
116	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	I78E22000100001	SPUGNA - SAN GIORGIO SU LEGNANO - ALLEGGERIMENTO VIA STURZO	Esecuzione	Termini rispettati	In Corso	No
117	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	I88E22000020001	SPUGNA - CORNAREDO - RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SAN MARTINO	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	No
118	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	I88E22000030001	SPUGNA - GARBAGNATE MILANESE - DISCONNESSIONE PIAZZA MADRE TERESA DI CALCUTTA	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	No
119	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	I88E22000040001	SPUGNA - GARBAGNATE MILANESE - DISCONNESSIONE VIA DEI TIGLI-VIA PER CESATE	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	No
120	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	I88E22000050001	SPUGNA - GARBAGNATE MILANESE - DISCONNESSIONE VIA COMO-VIA VENEZIA	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	No
121	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	I88E22000060001	SPUGNA - OPERA - ALLEGGERIMENTO VIA GRAMSCI, SOGLIANI, FALCONE	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	No
122	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	I88E22000070001	SPUGNA - OPERA - DISCONNESSIONE VIA STAFFORA	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	No
123	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	I88E22000080001	SPUGNA - OPERA - DISCONNESSIONE VIA BORSELLINO	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	No
124	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	I88E22000090001	SPUGNA - OPERA - ALLEGGERIMENTO VIA BOZZINI	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	No
125	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	I88E22000100001	SPUGNA - OPERA - ALLEGGERIMENTO VIA EMILIA VIA LOMBARDI	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	No
126	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	I88E22000110001	SPUGNA - OPERA - ALLEGGERIMENTO VIA DI VITTORIO	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	No
127	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	I88E22000140001	SPUGNA - SOLARO - RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA ACHILLE GRANDI	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	No
128	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	I88E22000150001	SPUGNA - SAN GIULIANO MILANESE - DISCONNESSIONE VIA GOGOL	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	No

N	INTERVENTO	CUP	DESCRIZIONE	FASE PROCEDURALE (da Tabella PNRR al 30 giugno 2024)	cronoprogramma rispettato (da Tabella PNRR al 30 giugno 2024)	CONCLUSO/IN CORSO (da ReGiS al 30 gennaio 2025)	Flag progetti in essere
129	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	I88E22000160001	SPUGNA - SAN GIULIANO MILANESE - DISCONNESSIONE VIA MONTENERO	Esecuzione	Termini rispettati	In Corso	No
130	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	I88E22000170001	SPUGNA - SAN GIULIANO MILANESE - DISCONNESSIONE VIA DELLA REPUBBLICA	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	No
131	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	I88E22000180001	SPUGNA - SEDRIANO - RIQUALIFICAZIONE VIA FAGNANI	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	No
132	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	I91B22000690001	LINEA RADIALE 12 ZONE OMOGENEE: MAGENTINO-ABBIATENSE E SUD-OVEST LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL BICIPLAN METROPOLITANO CAMBIO - LINEA 12	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	No
133	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	I98E22000000001	SPUGNA - BARANZATE - RIQUALIFICAZIONE VIA CONCILIAZIONE-VIA ERBA	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	No
134	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	I98E22000010001	SPUGNA - BARANZATE - RIQUALIFICAZIONE VIA ROSMINI (AREA EX GALVAN)	Esecuzione	Dato Mancante	In Corso	No
135	M5C2I2.02-Piani urbani integrati	I98E22000030001	SPUGNA - SEGRATE - ALLEGGERIMENTO VIA MONDADORI - VIA BUOZZI	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	No
136	M5C2I2.03-Programma innovativo della qualità dell'abitare	B81I21000020005	CUP 5 - ID 101 CITTA METR. DI MILANO	Aggiudicazione	Termini NON rispettati	In Corso	No
137	M5C2I2.03-Programma innovativo della qualità dell'abitare	B85H21000210005	CUP 4 - ID 101 CITTA METR. DI MILANO	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	No
138	M5C2I2.03-Programma innovativo della qualità dell'abitare	C41B21000070001	CUP 6 - ID 103 CITTA METR. DI MILANO	Stipula contratto	Termini NON rispettati	In Corso	Sì
139	M5C2I2.03-Programma innovativo della qualità dell'abitare	C41I21000020001	CUP 4 - ID 103 CITTA METR. DI MILANO	Stipula contratto	Termini NON rispettati	In Corso	Sì
140	M5C2I2.03-Programma innovativo della qualità dell'abitare	C41I21000030001	CUP 5 - ID 103 CITTA METR. DI MILANO	Stipula contratto	Termini NON rispettati	In Corso	Sì

N	INTERVENTO	CUP	DESCRIZIONE	FASE PROCEDURALE (da Tabella PNRR al 30 giugno 2024)	cronoprogramma rispettato (da Tabella PNRR al 30 giugno 2024)	CONCLUSO/IN CORSO (da ReGiS al 30 gennaio 2025)	Flag progetti in essere
141	M5C2I2.03-Programma innovativo della qualità dell'abitare	C91B21000060005	CUP 15 - ID 103 CITTA METR. DI MILANO	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	Sì
142	M5C2I2.03-Programma innovativo della qualità dell'abitare	C95D21000020005	CUP 13 - ID 103 CITTA METR. DI MILANO	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	Sì
143	M5C2I2.03-Programma innovativo della qualità dell'abitare	C97H21000140005	CUP 16 - ID 103 CITTA METR. DI MILANO	Stipula contratto	Termini rispettati	Concluso	Sì
144	M5C2I2.03-Programma innovativo della qualità dell'abitare	C99H21000000005	CUP 14 - ID 103 CITTA METR. DI MILANO	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	Sì
145	M5C2I2.03-Programma innovativo della qualità dell'abitare	D25B18003230001	CUP 7 - ID 103 CITTA METR. DI MILANO	Stipula contratto	Termini NON rispettati	In Corso	Sì
146	M5C2I2.03-Programma innovativo della qualità dell'abitare	E34C21000000001	CUP 6 - ID 101 CITTA METR. DI MILANO	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	No
147	M5C2I2.03-Programma innovativo della qualità dell'abitare	E38C20000320001	CUP 1 - ID 101 CITTA METR. DI MILANO	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	No
148	M5C2I2.03-Programma innovativo della qualità dell'abitare	E38C20000330001	CUP 3 - ID 101 CITTA METR. DI MILANO	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	No
149	M5C2I2.03-Programma innovativo della qualità dell'abitare	E38C20000340001	CUP 2 - ID 101 CITTA METR. DI MILANO	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	No
150	M5C2I2.03-Programma innovativo della qualità dell'abitare	J41B21000170001	CUP 10 - ID 103 CITTA METR. DI MILANO	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	Sì
151	M5C2I2.03-Programma innovativo della qualità dell'abitare	J41B21000180001	CUP 11 - ID 103 CITTA METR. DI MILANO	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	Sì
152	M5C2I2.03-Programma innovativo della qualità dell'abitare	J43D21000000001	CUP 12 - ID 103 CITTA METR. DI MILANO	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	Sì
153	M5C2I2.03-Programma innovativo della qualità dell'abitare	J47H21000220001	CUP 8 - ID 103 CITTA METR. DI MILANO	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	Sì
154	M5C2I2.03-Programma innovativo della qualità dell'abitare	J47H21000230001	CUP 9 - ID 103 CITTA METR. DI MILANO	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	Sì
155	M5C2I2.03-Programma innovativo della qualità dell'abitare	J81E21000060005	CUP 2 - ID 103 CITTA METR. DI MILANO	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	Sì

N	INTERVENTO	CUP	DESCRIZIONE	FASE PROCEDURALE (da Tabella PNRR al 30 giugno 2024)	cronoprogramma rispettato (da Tabella PNRR al 30 giugno 2024)	CONCLUSO/IN CORSO (da ReGiS al 30 gennaio 2025)	Flag progetti in essere
156	M5C2I2.03-Programma innovativo della qualità dell'abitare	J81E21000070005	CUP 3 - ID 103 CITTA METR. DI MILANO	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	Sì
157	M5C2I2.03-Programma innovativo della qualità dell'abitare	J81I21000010005	CUP 1 - ID 103 CITTA METR. DI MILANO	Stipula contratto	Termini rispettati	In Corso	Sì
